

河北町立小中学校整備基本構想（素案）

【中間報告】

令和7年 9月

河北町教育委員会

はじめに

河北町では、令和4年の第2次教育振興計画（後期計画）の策定において、今後5年間の施策のひとつに、児童数の減少による子どもたちの学びの環境の改善の必要性を課題としてあげております。

近年の急激な少子化、子どもを取り巻く教育環境の変化を踏まえ、「河北町立小学校のあり方検討委員会」で「町立小学校のあり方について（答申）」をとりまとめました。

教育委員会は答申を受け、将来の社会の担い手である子供たちにとって、よりよい教育環境を構築することを目的として、河北町立小学校の整備に向けた基本方針（令和6年10月）を策定しました。

本資料は、基本構想の内容、検討状況を中間報告としてまとめるものです。

－ 目次 －


第1章 基本構想・基本計画策定の背景	・・・ 1
1. 河北町の概要	・・・ 2
2. これまでの検討経緯	・・・ 8
第2章 統合・整備対象施設の現状と課題	・・・ 11
1. 現状調査概要	・・・ 12
2. 対象校の現状と検討課題	・・・ 13
3. 小学校の現状	・・・ 17
4. 中学校の現状	・・・ 40
5. 既存中学校校舎の老朽状況	・・・ 44
6. 学童保育クラブの現状と課題	・・・ 45
7. 給食調理施設の現状と課題	・・・ 51
第3章 計画条件の検討	・・・ 53
1. 計画地の検討	・・・ 54
2. 校舎・体育館の面積検討	・・・ 74
3. 整備方法の検討	・・・ 75
第4章 小中学校整備の基本コンセプト（案）	・・・ 81

第 1 章 基本構想・基本計画策定の背景

1. 河北町の概要

1) 河北町が目指す教育（関連計画）

河北町では、令和3年度からの「第8次河北町総合計画」に基づき、令和4年に「第2次教育振興計画」を改訂し、「第2次教育振興計画（後期計画）」を策定しました。計画においては、今後5年間の施策のひとつに、「児童数の減少による子どもたちの学びの環境の改善」の必要性を課題としてあげています。

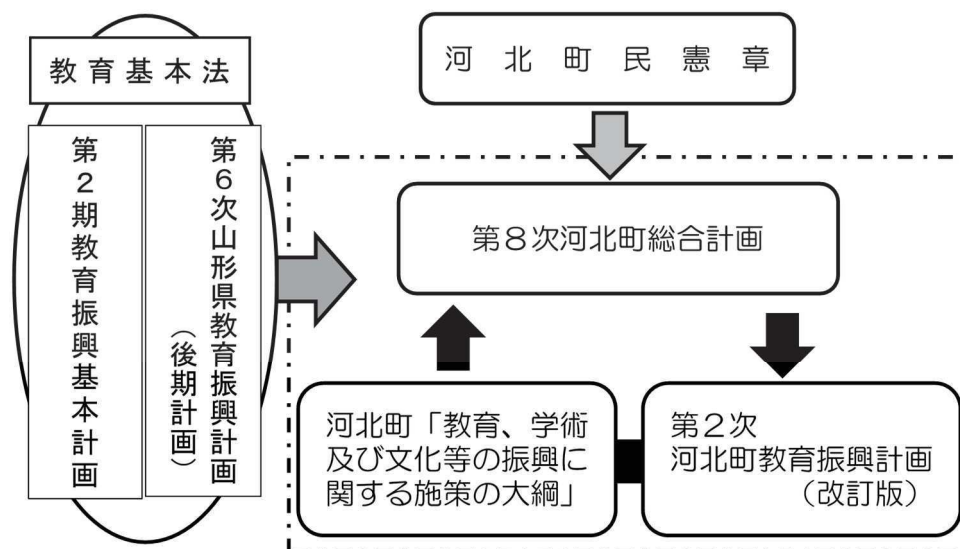

■第8次河北町総合計画の概要

町の将来像

「輝く人・町 夢と未来へ挑戦するまち」

まちづくりの目標

- 1 つながりを生む住みよい町
- 2 みんなで支えあう安全・安心な町
- 3 地域とともに健やかに暮らせる町
- 4 新たな魅力を発信しにぎわいのある町
- 5 ふるさとに学び次代につなぐ町

輝く人・町 夢と未来へ挑戦するまち



2) 河北町の教育環境整備に関する取り組み

河北町教育委員会では、現状の学校規模を生かした教育活動の実施に向け、授業研究会や各種研修会を通して教員の指導力の向上と共に教育環境の整備について取り組んできました。

3) 学校施設等の概要

①児童生徒数・学級数の推移

近年の急激な少子化により児童生徒数は減少傾向にあり、令和13年度には、児童400名程度、生徒330人程度となることが想定されています。令和13年度時点で学年当たりの学級数は、小学校1～3年生が2学級、4～6年生が3学級となり、新校舎竣工後4年目から全学年が学年当たり2学級となることが想定されます。

基準日：令和6年2月6日

学校 (改築年度)	建築 年数	改築当時		令和5年5月1日		令和11年		令和12年		備考
		児童数 生徒数	通常 学級数	児童数 生徒数	通常 学級数	児童数 生徒数	通常 学級数	児童数 生徒数	通常 学級数	
西里小(S60)	37年	250	8	88	6	38	4	32	4	3・4複式 5・6複式
溝延小(H4)	30年	256	11	68	6	43	4	33	3	完全複式
谷地中部小(H12)	21年	410	13	369	14	251	10	210	8	1～4年 単学級
谷地南部小(H9)	25年	358	12	162	6	138	6	133	6	学年 単学級
谷地西部小(S63)	35年	124	6	30	3	18	3	13	3	完全複式
北谷地小(H7)	27年	179	7	63	6	32	4	28	4	3・4複式 5・6複式
児童数		1577		780		520		449		
河北中(S54)	44年	860	21	410	14	374	13	376	13	1年：4学級 2年：5学級 3年：4学級
※令和12年の児童数は見込み、学級数は、現行制度が継続した場合のものです。										

河北町立小中学校の建築年数と学校規模の変化

(河北町教育委員会：河北町立小学校の整備に向けた基本方針 より転載)

令和13年度 小中学校 児童生徒数見込み(開校時学年毎)

(R7.5.1時点)

小学校	R8入学生	R9入学生	R10入学生	R11入学生	R12入学生	R13入学生	計
	6年生	5年生	4年生	3年生	2年生	1年生	
西里小	6	7	3	3	5	4	28
溝延小	10	6	9	0	3	6	34
谷地中部小	39	35	30	31	25	26	186
谷地南部小	19	22	22	23	14	23	123
谷地西部小	3	0	2	1	1	0	7
北谷地小	4	3	6	4	2	2	21
計	81	73	72	62	50	61	399
学級数	3	3	3	2	2	2	15


中学校	3年生	2年生	1年生	計
河北中学校	109	126	98	333
学級数	3	4	3	10

	合計
生徒児童数	732
学級数	25

※小学校は35人学級、中学校は40人学級とした場合

②検討対象施設の配置

現在、河北町には小学校6校、中学校1校があります。給食は谷地西部小学校に近接した給食センターから各校に配送しています。西里小学校、谷地中部小学校、谷地南部小学校、溝延小学校の4校に近接した位置に放課後児童クラブ施設があります。

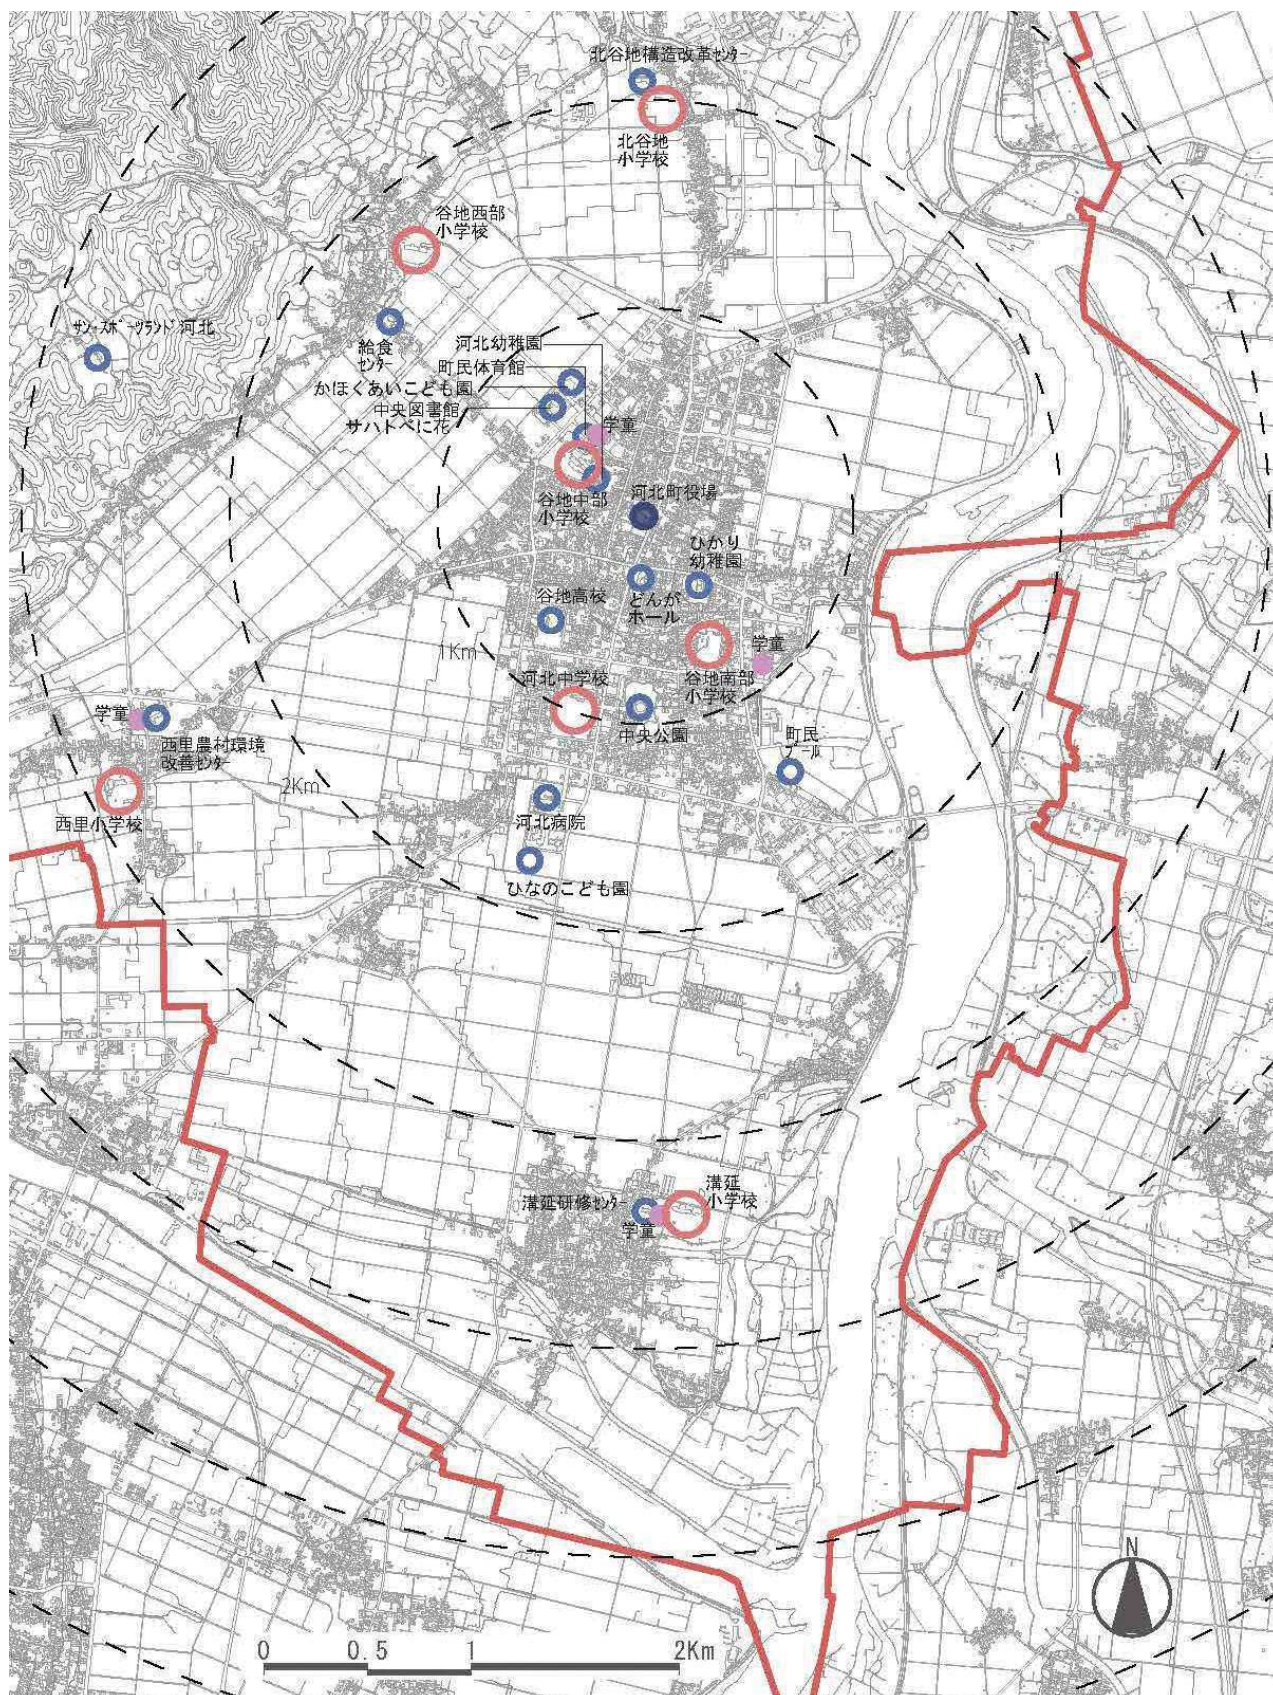

検討対象施設の位置図

③既存施設の概要

小学校校舎は、令和13年度時点で築31年～46年と比較的新しく、中学校校舎は築54年となります。

河北町では、平成30年度に小中学校すべての校舎を大規模改造工事(内装改修、外部改修、設備改修)しました。

河北中学校については、平成19年に耐震改修を実施した他、令和4年度には耐力度調査を行っています。耐力度調査の結果は5,259点であり、危険改築の必要は認められない状況です。一方で、校舎の老朽化等により、漏水等、様々な不具合も発生しています(詳細な老朽状況については、第2章参照)。

学校名	竣工年度	築年数※1	大規模改造年	校舎面積	体育館面積	耐力度調査結果※3
西里小学校	昭和60年	46年	平成30年	2,865㎡	959㎡	—
溝延小学校	平成4年	39年	平成30年	3,570㎡	1,092㎡	—
谷地中部小学校	平成12年	31年	平成30年	4,791㎡	1,100㎡	—
谷地南部小学校	平成9年	34年	平成30年	4,029㎡	1,104㎡	—
谷地西部小学校	昭和63年	43年	平成30年	1,871㎡	749㎡	—
北谷地小学校	平成7年	36年	平成30年	2,573㎡	825㎡	—
河北中学校	昭和52年	54年	平成30年※2	7,417㎡	1,454㎡	5,259点

※1 築年数は令和13年度時点

※2 河北中学校校舎は、大規模改造の他、平成19年に耐震改修を実施


※3 耐力度調査は令和4年度実施

既存小中学校基礎データ


4) 河北町ハザードマップ

河北町では、最上川の増水による洪水や山沿いの住宅地等における土砂災害のリスクがあり、防災対策が進められています。町では災害ハザードマップを公開し、住民に避難場所や防災情報を提供しています。また、冬の豪雪による交通の影響も考慮し、除雪体制の強化をしています。

町立学校施設のうち、西里小学校、谷地中部小学校、河北中学校を除く、4校はいずれも洪水による浸水想定区域あるいは土砂災害の警戒区域に立地しています。

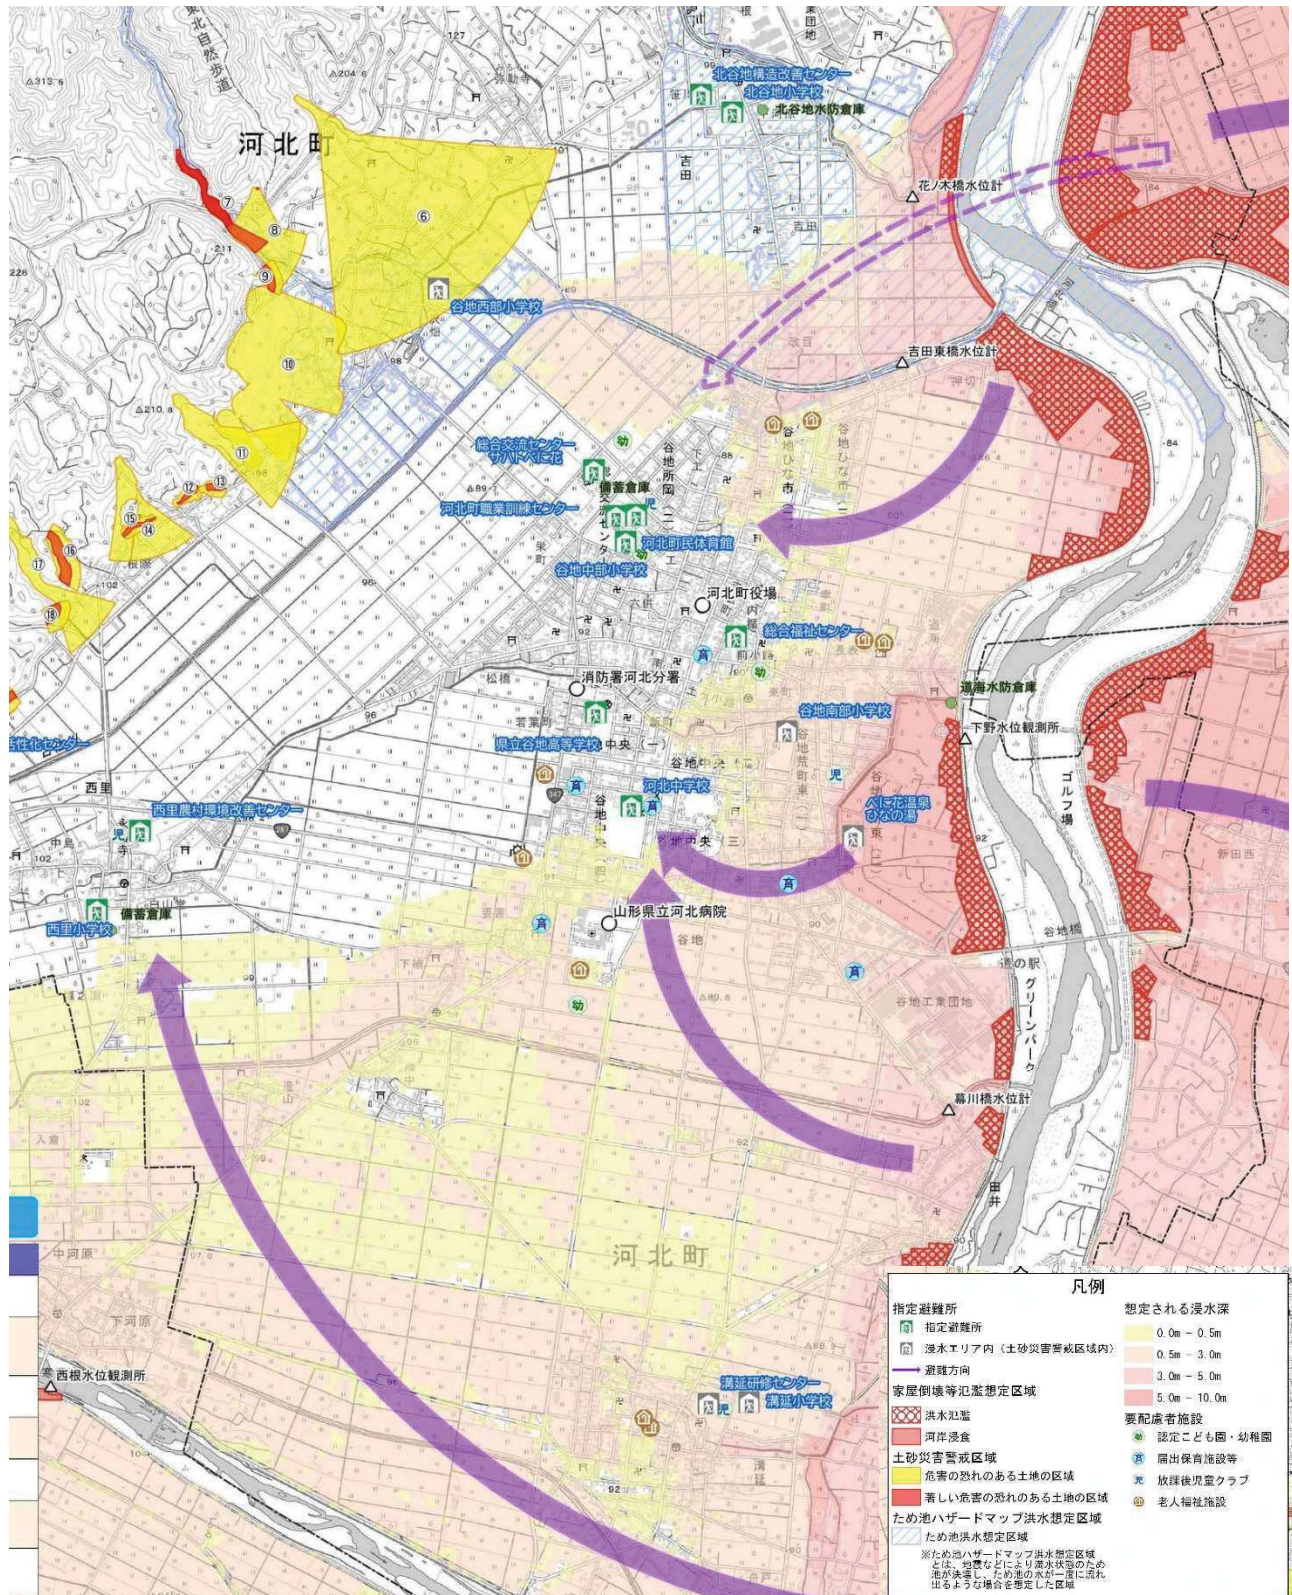

河北町災害ハザードマップ（洪水）

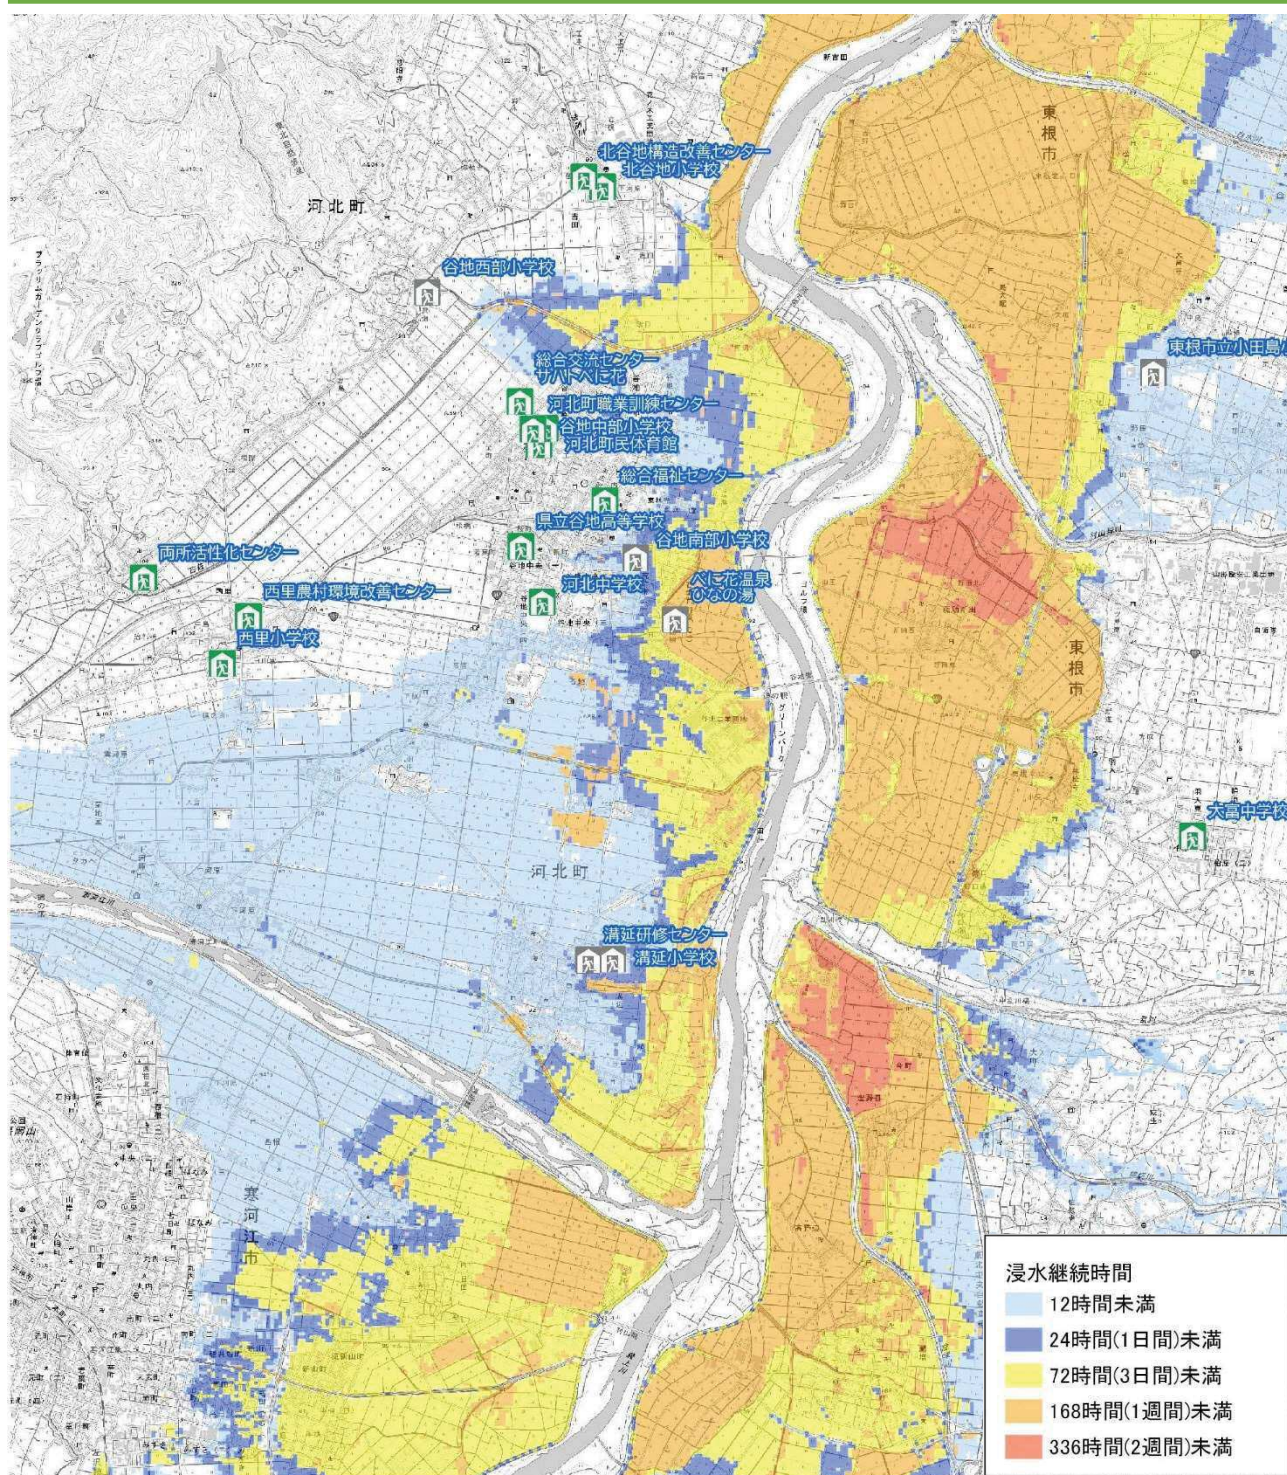

河北町浸水継続時間（洪水）

2. これまでの検討経緯

1) 河北町立小学校のあり方検討委員会

近年の急激な少子化、子どもを取り巻く教育環境の変化を踏まえ、「河北町立小学校のあり方検討委員会」（以下、「検討委員会」という）を設置し、以下の2つについて諮問しました。

①河北町立小学校の適正規模・適正配置について

②河北町立小学校の今後のあり方や将来の学校像等に対する本町の基本的な方針について

検討委員会では、地区懇談会、町民参加型の検討委員会の意見等を参考にしながら「町立小学校のあり方について（答申）」をとりまとめ、教育長に答申しました。

答申では、小学校は1校に統合することが最適であるということ、子どもたちにとって最適な学びの環境を構築するために、できるだけ早い統合に向けて取り組むこと、より教育効果を上げるために、中学校との一貫した教育活動が展開できるようにすることなどが示されました。

2) 河北町立小学校の整備に向けた基本方針

教育委員会は答申内容を、教育委員会議、総合教育会議、町議会に報告し、広報かほく・町ホームページにて周知するとともに、これまでの検討の経過や検討委員会による答申を尊重しながら設置形態を小中一貫校（施設一体型）という案にまとめ、「基本方針（素案）」を策定しました。さらに各地区での説明会や、幼稚園・認定こども園での説明会及びウェブでのアンケートを行い、ご意見をいただいたうえで基本方針（案）をとりまとめ、その後パブリックコメントを実施し、基本方針を策定しました。

基本方針には、町内の小学校を1つに統合し、新たな校舎を整備すること、老朽化が進む河北中学校の校舎整備も併せて行うこと、校舎は施設一体型とすること、最短で令和13年（2031年）4月1日の開校を目指すこと等の整備方針をあわせて示しました。

■検討委員会の答申を受けた基本方針

- 1 ふるさとに学び、いきいきと学びあい、互いに高めあうことで、次代を担う人材の育成に向けた教育活動を推進する。
- 2 河北町で目指す子ども像に迫るため小中一貫型小学校・中学校の設置形態をとり、幼児教育との接続を踏まえた、小中一貫教育を推進する。
- 3 児童数の推移を受けた学校の適正規模・適正配置を目指す。

■これまでの経緯

年 月	内 容
令和4年5月	河北町立小学校のあり方検討委員会設置 「1 河北町立小学校の適正規模・適正配置について」 「2 河北町立小学校の今後のあり方や将来の学校像等に対する本町の基本的な方針について」 諮問
令和4年7月	小学校のあり方及び将来の学校像に関するアンケート調査の実施 対象：保護者、各町内会より代表3名 合計1,409人 回答件数：930件 回答率：66.0%

年 月	内 容
令和4年9月～ 令和5年2月	地区懇談会の実施 小学校区毎計6回開催
令和5年8月	町民参加型であり方検討委員会を開催 45名参加
	河北町立小学校のあり方検討委員会 全7回開催
令和5年12月	「河北町立小学校のあり方について」答申 「1校に統合することが最適である」という検討結果になり、併せて「校舎を新設し、中学校との一貫した教育活動が展開できるようにすること」をはじめとする学びの環境を整えることや特色ある教育、教育課題に対する対応について示された。
令和6年1月	河北町立小学校の整備に向けた基本方針（素案）策定
令和6年2月	基本方針策定に向けた地区説明会 町内4会場全5回開催 計75名参加
令和6年4月～ 6月	町内認定こども園・幼稚園における説明会 町内4園全5回開催 計125名参加 町内認定こども園・幼稚園保護者向けアンケート実施 回答件数：123件
令和6年8月	河北町立小学校の整備に向けた基本方針（案）策定
令和6年9月	河北町立小学校の整備に向けた基本方針（案）のパブリックコメント 意見：件数52件 人数19人
令和6年10月	河北町立小学校の整備に向けた基本方針策定 主な内容 1 設置形態について 小中一貫型小学校・中学校とする 経営方針は、小中一貫教育を柱とします 9年間を見通した教育課程を編成し、系統的な教育を実施する 2 学校の新設・改築について 町内の小学校をひとつに統合し、新たな校舎を整備 老朽化がすすむ河北中学校の校舎整備も併せて行う 施設形態は施設一体型とする 最短で令和13年(2031年)4月1日開校を目指す

2) 河北町立小中学校整備委員会（令和7年6月基本構想のまとめ時点）

河北町教育委員会は、「河北町立小学校の整備に向けた基本方針」に基づき、河北町立小中学校の整備についての基本構想・基本計画を策定するために必要な事項を検討するため、河北町立小中学校整備委員会を設置し、基本コンセプト、計画地の選定方針、整備方法の検討等を行っています。

■学校整備委員会のスケジュールと主な内容

令和7年	1月30日	第1回	学校整備委員会	これまでの経緯等について
	3月28日	第2回	学校整備委員会	計画地・整備方法について
令和7年	6月17日	施設研修	先進地事例視察	
			福島県大熊町	義務教育学校 大熊町立 学び舎 ゆめの森
	7月2日	第3回	学校整備委員会	計画地・整備方法について
	9月	第4回	学校整備委員会	基本構想（素案）について
	10月		町民説明会	
		第5回	学校整備委員会	基本構想・基本計画（素案）について
	11月	第6回	学校整備委員会	基本構想・基本計画（案）について
	12月		パブリックコメント、町民説明会	
令和8年	1月		河北町立小中学校整備基本構想・基本計画策定	

3) 小中一貫型小学校・中学校の整備

本町では、これまで第2次河北町教育振興計画にかかげる基本目標の達成に向けて小中連携を図ってきました。この取り組みをさらに推進するために、小中一貫教育をより実践的に推進してまいります。小中一貫教育の設置形態については、小中一貫型小学校・中学校と義務教育学校とがあります。

一人の校長の下、一つの教職員組織が置かれ、義務教育9年間の教育課程となる義務教育学校としたときに、本町の場合、児童生徒数の規模が大きくなることにより、学校統合による生徒児童の精神的な負担が大きくなる懸念されます。

一方、小中一貫型小学校・中学校は、基本的な小学校、中学校の基本的な枠組みは残したまま、9年間の教育課程を実施する学校です。これまでの小中連携の取り組みを基盤として一貫教育にレベルアップさせるイメージです。本町では、小学校、中学校それぞれの文化を大事にしながら、小中一貫教育を推進できる小中一貫型小学校・中学校が望ましいと考えます。小学校と中学校は別々にあるけれど、施設一体型とすることで、物理的な距離が近くなり、児童生徒同士及び教員同士のより積極的な交流が可能となり、教育効果を高めていくことができます。

よって、本町では施設一体型の小中一貫型小学校・中学校の整備をすすめていきます。

第2章 統合・整備検討対象施設の現状と課題

1. 現状調査概要

1) 調査目的

本章においては、町立既存小学校および中学校、放課後児童クラブの施設および運営状況の調査結果を示し、本事業における検討課題を整理します。

2) 調査方法

①目視調査・机上分析

- ・学校施設台帳をもとに目視調査を行い、施設の各スペースおよび運用状況等を写真撮影し整理する。
- ・施設配置や施設構成を図面化し、施設の特色、学校運営状況等を分析する。
- ・アンケート調査を行い、現状の課題や新施設への要望を把握する。
- ・河北中学校の老朽状況について、現地確認する。

②学童クラブ施設調査

- ・施設を訪問し目視・計測により施設構成を図示し、施設の状態を把握する。
- ・運営状況を管理者にヒアリングし、施設の状態をあわせて運営状況等を分析する。

3) 調査対象施設／調査日

①目視調査・机上分析

- | | |
|--------------|--------------------|
| ・西里小学校 | ／令和7年1月 8日実施 |
| ・溝延小学校 | ／令和7年1月 8日実施 |
| ・谷地中部小学校 | ／令和7年1月 8日、5月15日実施 |
| ・谷地南部小学校 | ／令和7年1月 8日実施 |
| ・谷地西部小学校 | ／令和7年1月 8日実施 |
| ・北谷地小学校 | ／令和7年1月 8日実施 |
| ・河北中学校 | ／令和7年1月 8日、5月16日実施 |
| ・河北町学校給食センター | ／令和7年2月27日実施 |

②学童クラブ施設調査

- | | |
|-----------------|--------------|
| ・ちびっこ放課後西里学童クラブ | ／令和7年5月15日実施 |
| ・ちびっこ放課後学童クラブ | ／令和7年5月15日実施 |
| ・学童保育所 さくらクラブ | ／令和7年5月16日実施 |
| ・学童保育所 溝延さくらクラブ | ／令和7年5月16日実施 |

2. 対象校の現状と検討課題

1) 配置計画

①校舎の配置

- ・校舎は敷地北側に日影・残雪がないよう、どの学校も北側に配置している。
- ・校舎の階数は、最大で3階である。

⇒日影・残雪を考慮し、計画地の状況に応じた校舎の配置計画

⇒規模・計画地に応じた階数の考え方の検討

■既存施設の階数

西里小学校	：3階建て（普通教室1-2階）
溝延小学校	：3階建て（普通教室1-2階、3階は音楽室のみ）
谷地中部小学校	：2階建て（普通教室1-2階）
谷地南部小学校	：3階建て（普通教室1-3階）
谷地西部小学校	：2階建て（普通教室1-2階）
北谷地小学校	：2階建て（普通教室1-2階）
河北中学校	：3階建て（普通教室1-3階）

②体育館の配置

- ・体育館は、基本的に校舎の西側に配置している。
- ・敷地が東西の西側のみに接道している場合には、東側に体育館を配置している。
- ・すべての学校で、体育館には、専用の地域玄関を設けている。

⇒体育館配置の考え方の検討

■既存施設の体育館配置

西里小学校	：校舎の西
溝延小学校	：校舎の東（校舎の西は駐車場）
谷地中部小学校	：校舎の西
谷地南部小学校	：校舎の西
谷地西部小学校	：校舎の東（校舎の西は駐車場）
北谷地小学校	：校舎の西
河北中学校	：校舎の西

③グラウンド・遊具スペース

[既存小学校]

- ・200m程度の陸上トラック、100m直走路を確保できる広さのグラウンドがある。
- ・遊具スペース（天然芝生舗装）、築山がある。

[既存中学校]

- ・300m程度の陸上トラック、100m直走路を確保できる広さのグラウンドがある。
- ・野球とテニス専用の競技スペースがある。
- ・グラウンドの一部防球ネット支柱にナイター照明設備が設置されている。

⇒部活動専用の野球場、テニスコートの必要性の確認

（部活動の地域展開、中央公園、廃校グラウンド・体育館利用の可能性を考慮）

⇒学校グラウンドにナイター設備は、周辺住宅地等への影響を考慮し設置しないことの確認

⇒遊具スペースの考え方の検討

⇒小中学校のグラウンド等共用、棲み分け利用の考え方の検討

⇒防球ネットの仕様・高さ等について、周辺住宅地等への影響を考慮し検討

④プール

・すべての小学校に屋外プールがある。

⇒計画地内にプールを設置しない方針の確認

⑤駐車場・門の位置づけ

・駐車スペースは、すべての学校で昇降口・玄関にアクセスしやすい位置で、校舎の日影になりづらい位置に配置している。

・給食・給油等サービス車両は、歩車分離のため、すべての学校で北側からアクセスしている。

・河北中学校は、敷地にアクセスしやすい東西に門を設けており、東門を一般車両と歩行者、西門を自転車と歩行者に限定し、車両の通り抜けを禁止し、自転車と車両の交錯を避けて運用している。

・現在の中学校では、学校周囲および学校敷地内までの送迎を認めていない。

⇒駐車スペースの必要台数・配置条件（歩車分離等）の検討

⇒バスおよび保護者の送迎ルールについて検討

■既存施設の駐車場配置

西里小学校	：校舎の北（川を挟んだ飛び地）	約 1 1 台
溝延小学校	：校舎の西（北・西に接道）	約 1 5 台
谷地中部小学校	：校舎の南	約 7 0 台（教職員約 58、来校者 12）※バス 2 台
谷地南部小学校	：校舎の南	約 3 2 台
谷地西部小学校	：校舎の西（南・西に接道）	約 1 5 台
北谷地小学校	：校舎の東	約 3 5 台
河北中学校	：校舎の南	約 6 0 台

⑥菜園

・すべての小中学校に菜園がある。

・中学校の菜園は特別支援教室で利用している。

⇒菜園の利用方法・規模の検討

2) 施設構成

①普通教室ゾーン

- ・教室はすべて南向きで採光を確保している。
- ・小学校は、低学年、中学年、高学年のまとまりをつくっている学校が多い。

⇒小中一貫教育の考え方、将来の教育・運営方法の変化に対応する教室ゾーンの検討

②特別支援教室

- ・小学校は、管理諸室と行き来しやすい位置に特別支援教室をまとめて配置している。
- ・中学校は普通教室と同じ棟と管理諸室と連続した位置に特別支援教室を分散して配置している。

⇒インクルーシブの考え方をもとに特別支援教室のあり方を検討する。

③食堂（ランチルーム）／多目的ホール

- ・すべての小学校に多目的利用のランチルームがある。中学校にはランチルームがない。
- ・特別教室を利用する授業が重なる場合に、食堂を利用することがあった（谷地中部小学校の例）。

⇒ランチルームの整備方法（他機能と兼用、多目的利用等）・規模の検討

3) 普通教室の寸法／オープンスペース（OS）

- ・各学校で普通教室の寸法が異なる。

⇒適切な教室寸法、オープンスペースの設置方法の検討

■既存普通教室の寸法／OS有無（幅）

西里小学校	: 7.3m×10.0m	／無
溝延小学校	: 7.0m×7.5m	／有（約7.0m）
谷地中部小学校	: 8.0m×8.0m	／有（約7.0m）
谷地南部小学校	: 8.0m×7.5m	／有（約8.0m）
谷地西部小学校	: 7.0m×7.5m	／有（約7.0m）
北谷地小学校	: 7.5m×8.0m	／有（約6.5m）
河北中学校	: 7.5m×10.0m	／無

■オープンスペースの使用例（谷地中部小学校の場合）

- ・ロッカー配置により、教室をオープンスペース側に拡張して利用している他、低学年ではオープンスペース側に学級ごと移動し、床座で活動する等、利用の仕方に応じて教室とオープンスペースを自在に利用している。

4) 図書室／パソコン室

- ・
- ・谷地中部小学校は、一時的な学級数増に対応するため、図書室を普通教室に転用している。書架の一部は、旧パソコン室、パソコン室前のラウンジ空間に移動し、調べ学習等で利用している。
- ・北谷地小学校の図書室は食堂（多目的ホール）と連続した位置にコーナーとして設けている。

⇒図書館規模を検討し、多目的ホールと図書室等、別用途との一体化をあわせて検討

5) 特別教室

- ・大きな規模の谷地中部小学校では、一部教科について利用が重なることがある。
- ・小さな規模の溝延小学校では、図工と家庭科の特別教室を兼用することで教室数を調整している。

⇒教科横断的な特別教室の設置、食堂と家庭科室・音楽室等の教科等横断的な学習空間の検討

6) 昇降口まわり

- ・すべての小学校に風除用の建具がある。
- ・履き替え方式が線履き替えと面履き替えの学校がある。

⇒風除機能、履き替え方式の検討

■昇降口の仕様／履き替え方式

西里小学校	：風除室タイプ	／線履き替え・上履き別途
溝延小学校	：風除室タイプ	／上履き一体
谷地中部小学校	：風除室タイプ	／線履き替え・上履き一体
谷地南部小学校	：風除室タイプ	／線履き替え・上履き一体
谷地西部小学校	：風除室タイプ	／線履き替え・上履き別途（コート掛けあり）
北谷地小学校	：風除室タイプ	／上履き一体
河北中学校	：共用部タイプ	／上履き一体

7) 管理諸室

- ・職員室と事務室が一体となっている小学校が多い。
- ・すべての学校で職員室と校長室は隣接した配置としている。

⇒事務室の位置づけの検討

⇒ウエルビーイングの考え方をもとに管理諸室のあり方を検討

8) 体育館等

- ・体育館を1階に配置し、地域利用玄関を設けている。
- ・各校の体育館にステージがある。

⇒地域利用に必要な玄関等スペースの検討

⇒ステージ機能の検討（小中両方に設けるか等）

9) その他


- ・会議室（和室）をすべての小学校で設置している。

⇒和室および会議機能の考え方を検討

3. 小学校の現状

1) 西里小学校

①校地の利用状況

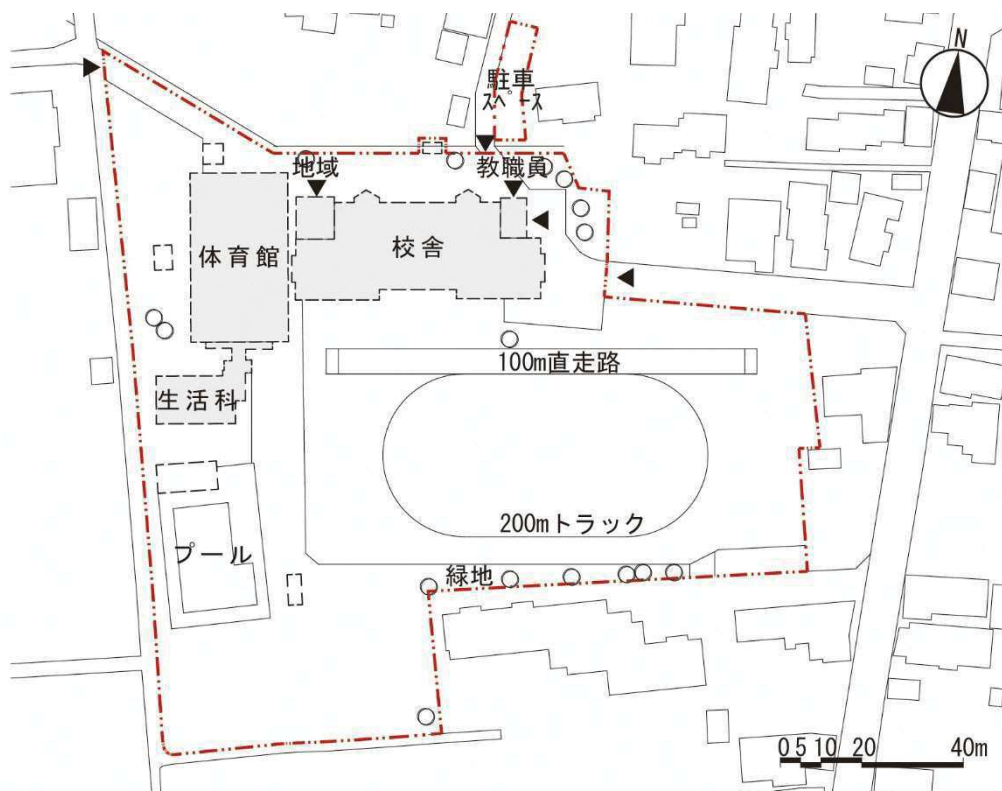

配置図


②施設構成

■特徴

1階に管理諸室、食堂等および体育館やパソコン室等の地域利用施設、2階南側に普通教室を配置し、校舎の北側に2か所の階段と図書室、3階に特別教室をまとめたコンパクトな校舎である。

食堂内の一部を廊下として利用しているのが、動線計画の特徴である。

地域玄関を体育館に近接した校舎内に設け、ホール空間を設けている。

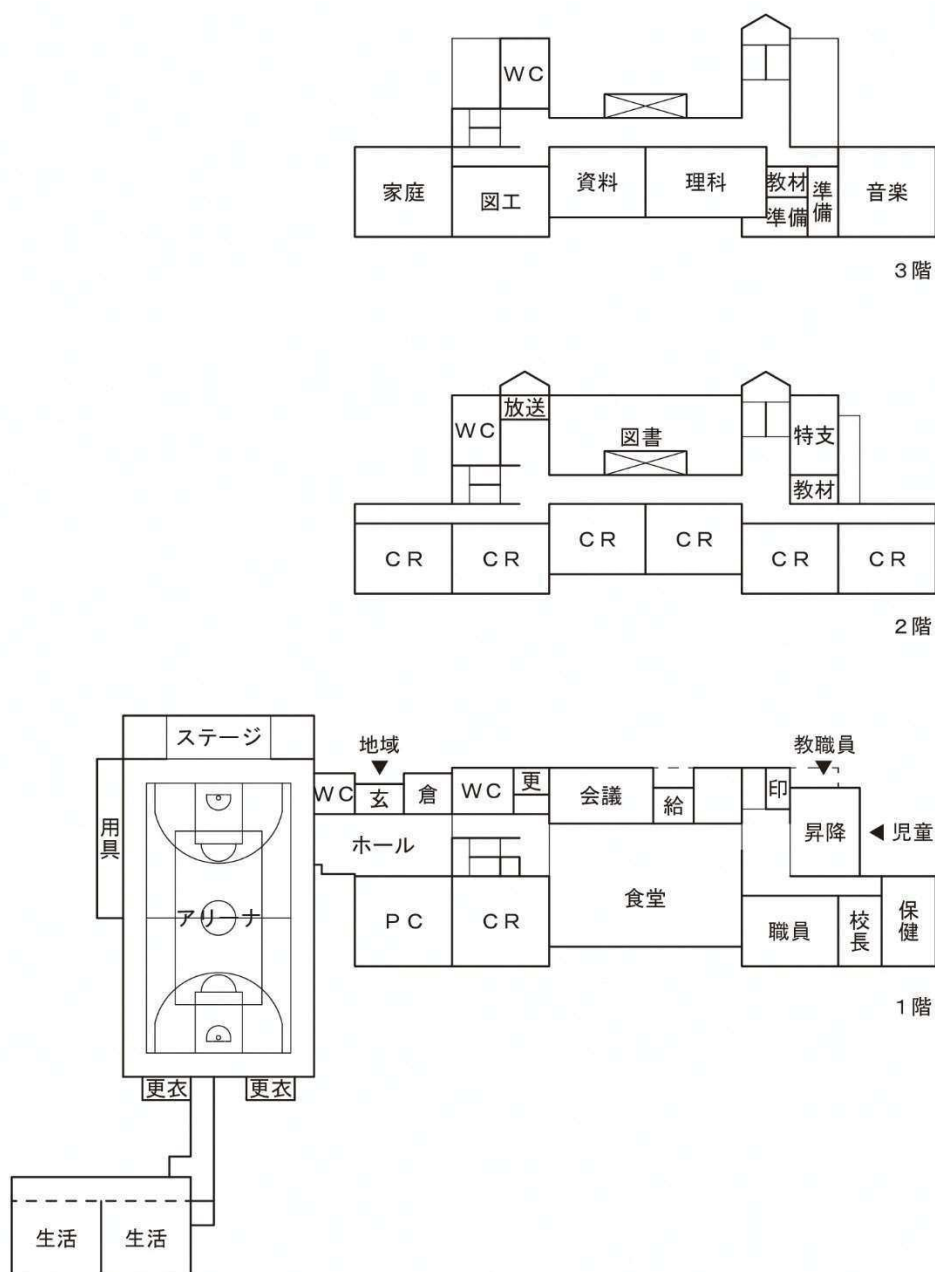

③各室・スペースの状況



普通教室



普通教室



特別支援教室




理科室



理科室



音楽室

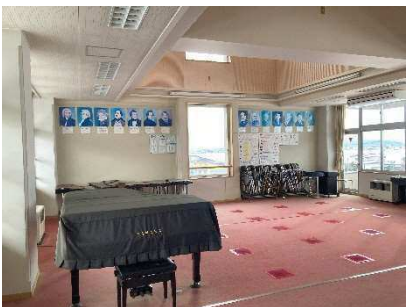

音楽室



音楽準備室



図工室



図工室



家庭科室




家庭科室



図書室カウンターまわり



図書室カウンター書架

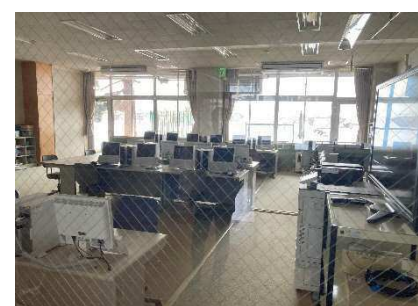

PC室黒板まわり



普通教室（多目的室）



生活科室



生活科室



校長室前の展示棚



職員室



職員室




校長室



校長室



保健室

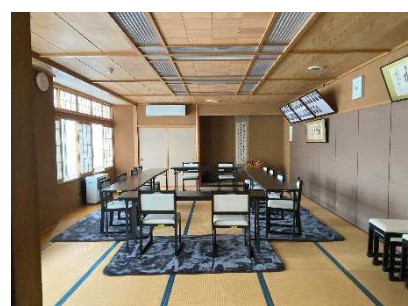

会議室（和室）



昇降口



昇降口



食堂




教室まわりの水場



アリーナ

2) 溝延小学校

①校地の利用状況

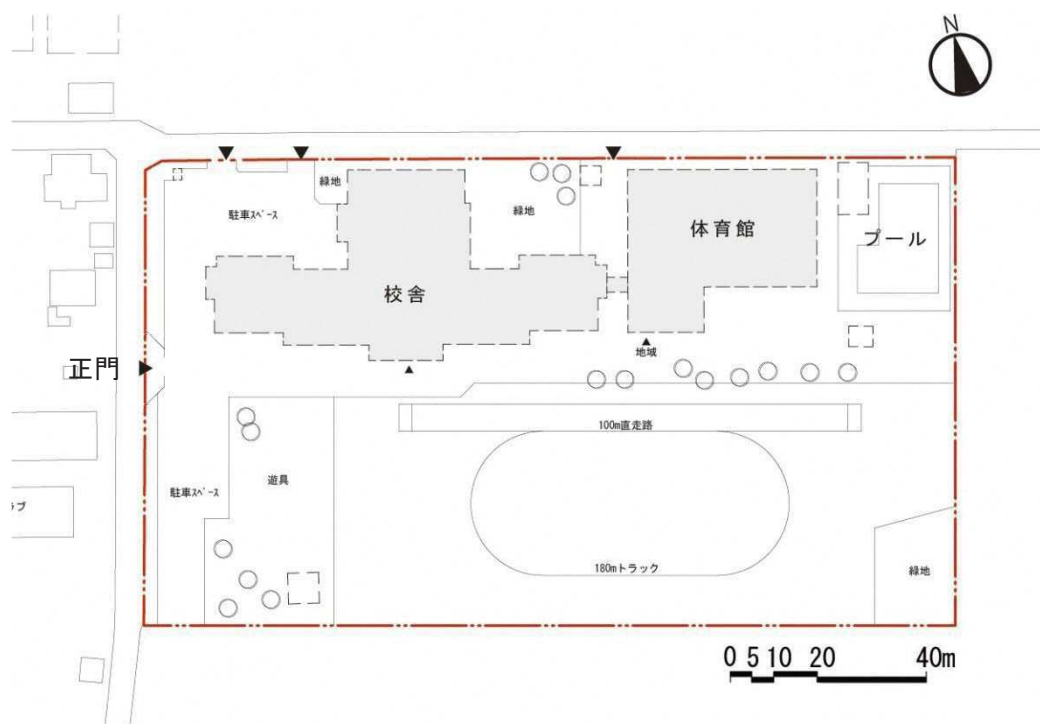

配置図

②施設構成


■特徴

昇降口・ホール・食堂（1階）、図書室・特別教室（2階）、音楽室（3階）を中心として左右にオープンスペースのある普通教室を配置している。昇降口の東側に管理諸室をまとめ、その東側に体育館を配置している。学校規模に対し、非常に大きな建築ボリュームの施設である。


体育館に隣接してミーティングスペース・地域玄関を設けている。



3 階 平 面

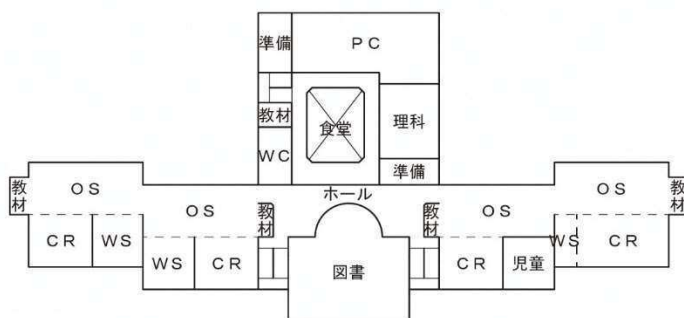

2 階 平 面

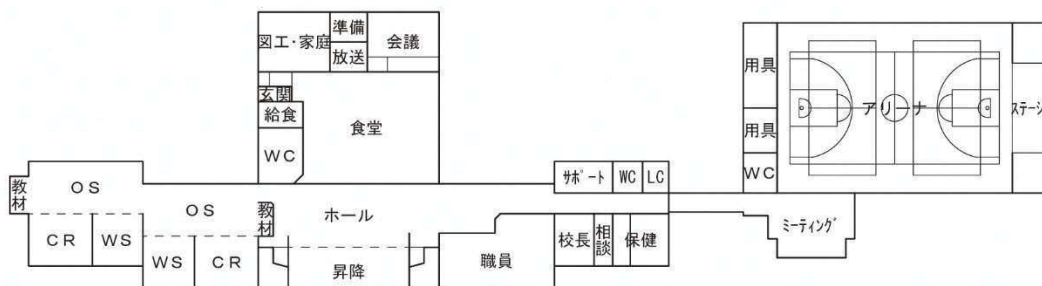

1 階 平 面

③各室・スペースの状況



普通教室



普通教室



普通教室



理科室



理科室



理科室



音楽室



音楽室



図工・家庭科室



図工・家庭科室



図書室



図書室



ランチルーム上部吹抜け




アリーナ前地域玄関ホール



アリーナ

3) 谷地中部小学校

①校地の利用状況

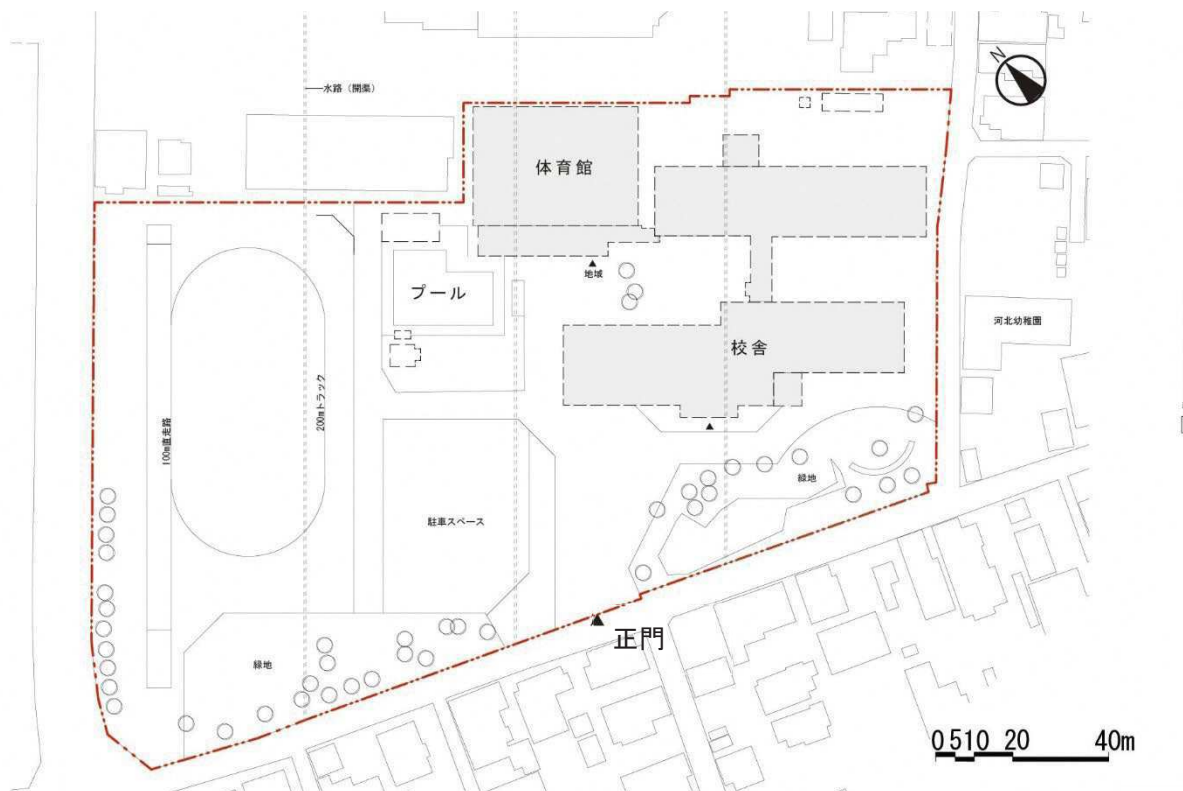

配置図

②施設構成

■特徴


南北の校舎棟を渡り廊下で接続している。

北側校舎棟の東側1・2階と南側校舎棟の2階に、2学年ごとの普通教室を配置している。


南側校舎棟の1階に管理諸室をまとめ、2階西側に特別教室をまとめている。

現在は学級数が多くなっているため、図書室、多目的教室、特別教室等も普通教室に割り当てている。

北側校舎棟の西側に食堂と体育館を配置し、体育館には地域玄関を設け、地域や学童クラブの活動で利用している。

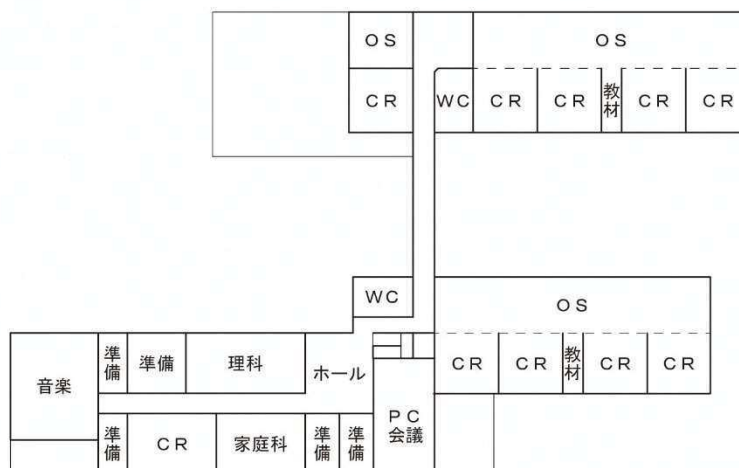

2 階 平 面

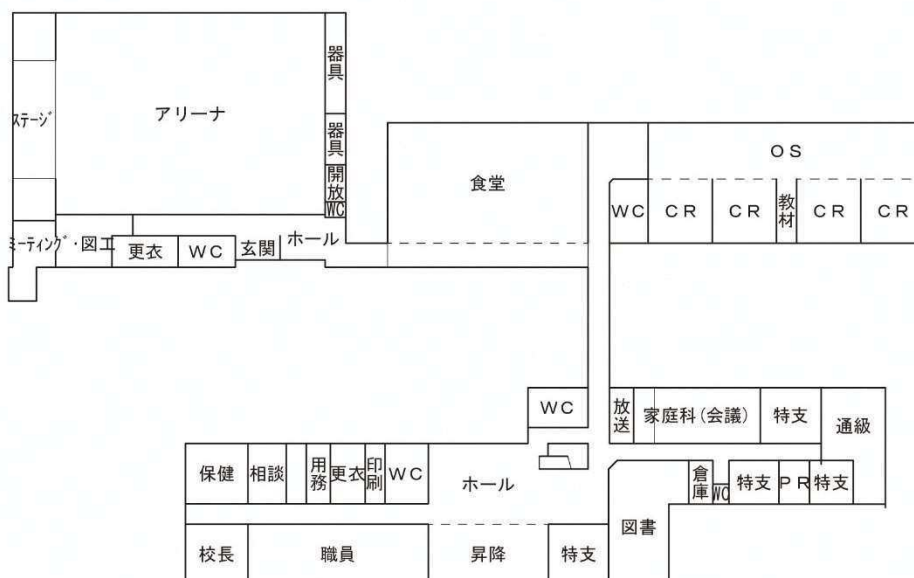

1 階 平 面

③各室・スペースの状況



普通教室



普通教室



オープンスペース



理科室



理科室



理科室



理科準備室



音楽室



音楽室



音楽室



音楽室



音楽準備室



家庭科室



家庭科室



家庭科室



図書室



図書室



パソコン室



パソコン室



ホール



ホール



ホール



家庭科室（会議室）



図書室前の掲示面



普通教室前の展示



保健室前の掲示等



保健室前の掲示等



職員室前の掲示面



職員室



給湯室



保健室



印刷室



昇降口



普通教室前の廊下



普通教室前の廊下



普通教室まわりの共用部




食堂



食堂



菜園

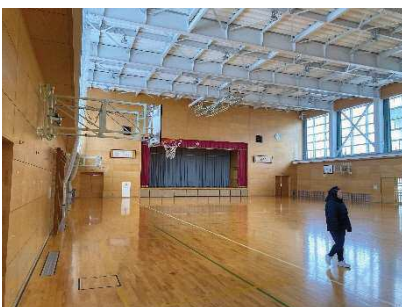

アリーナ





地域玄関



アリーナ前の展示

4) 谷地南部小学校

①校地の利用状況

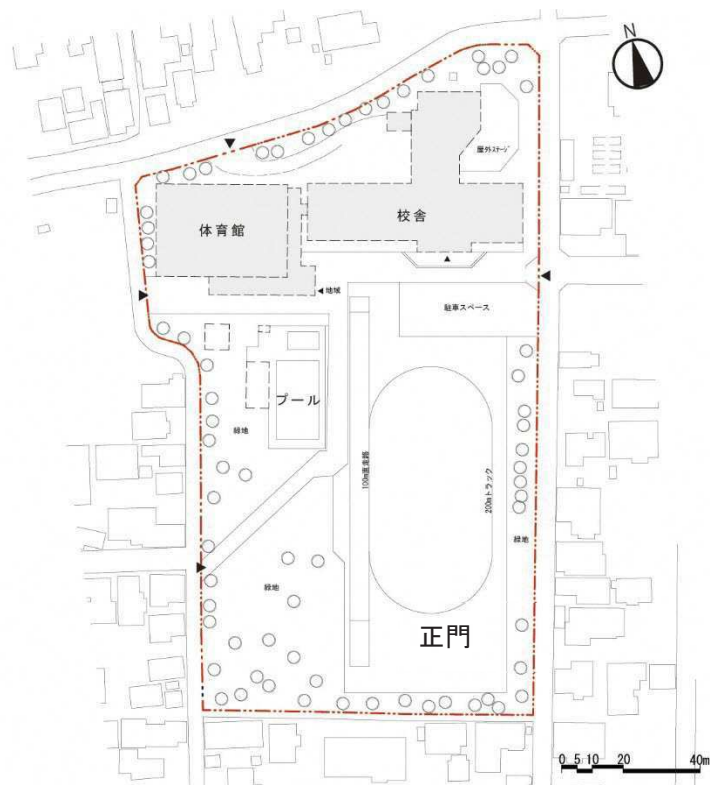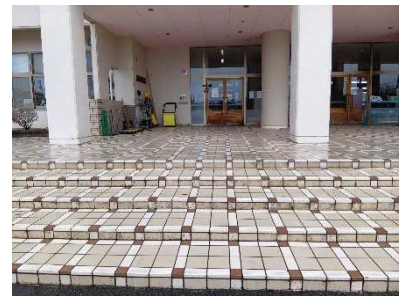


配置図

②施設構成


■特徴

校舎全体はT字の変則的な形状となっており、主に南側に面する棟の西側2・3階に2学年ごとの普通教室を配置している他、東側の1・2階に学年ごとの普通教室を配置している。


北側に延びる校舎部分を中心に図書室、特別教室、食堂等を配置している。

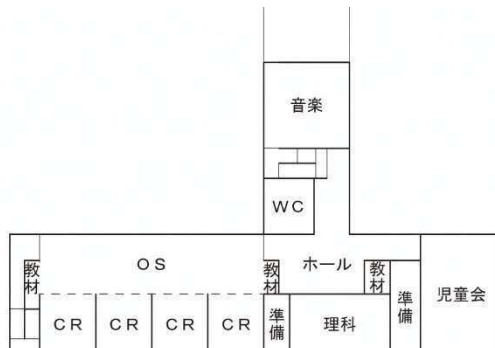

3 階 平 面

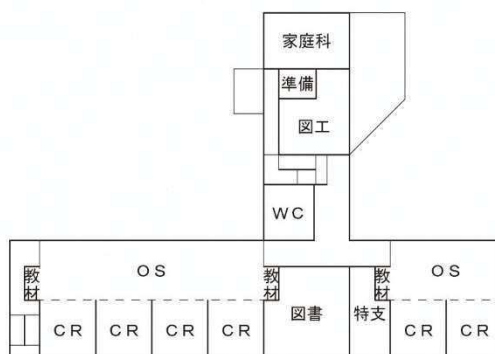

2 階 平 面

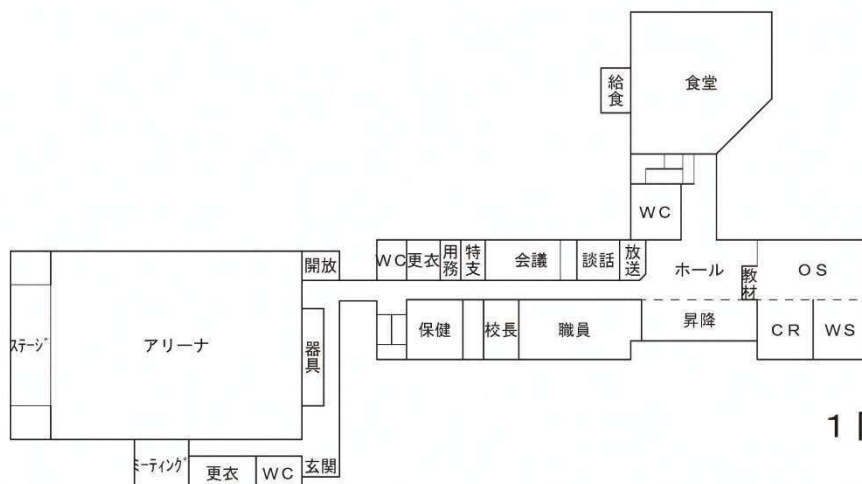

1 階 平 面

③各室・スペースの状況



普通教室



普通教室



普通教室



普通教室



普通教室



理科室



理科室



理科室



音楽室



音楽室



音楽室



図工室



図工室



家庭科室



家庭科室



家庭科室



児童会室



児童会室



ホール



廊下の展示



廊下の展示



教材室



昇降口まわりのピロティ



昇降口まわりのピロティ



昇降口まわりのピロティ



トイレ



トイレ




トイレ



児童会室前の廊下



普通教室まわりの共有部

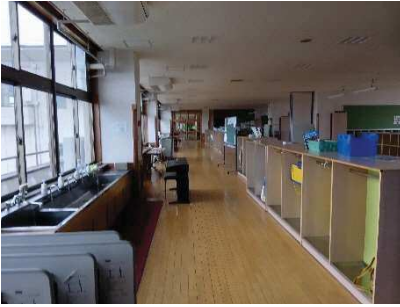

普通教室まわりの共有部



普通教室まわりの共有部



地域玄関



アリーナ



アリーナ



アリーナ



ステージ



ステージ




アリーナ入り口



アリーナ入口




食堂

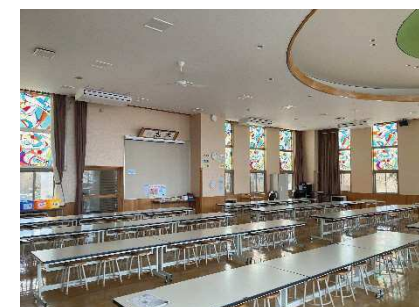

食堂

5) 谷地西部小学校

①校地の利用状況

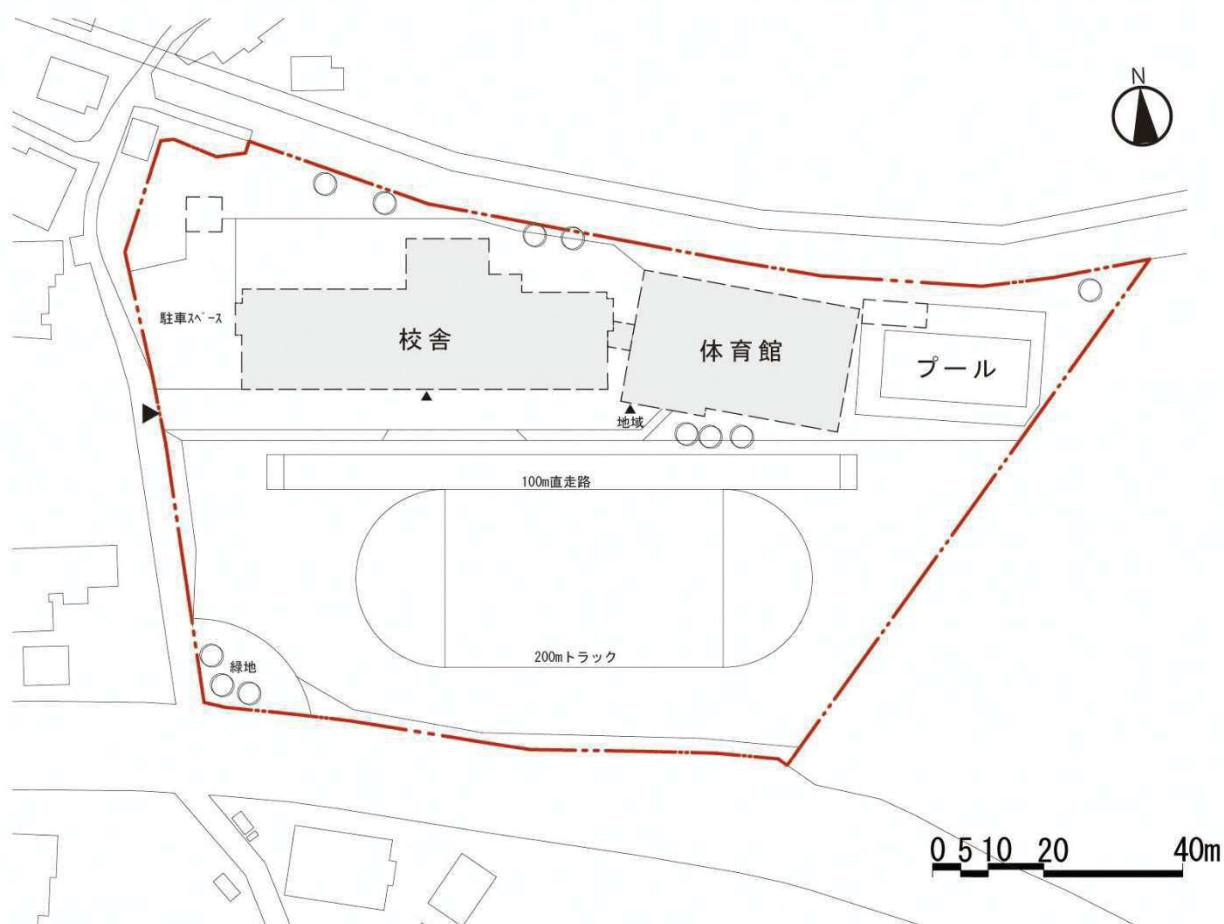

配置図


②施設構成

■特徴

2階建ての一文字型校舎の中央に玄関・玄関ホール、多目的ホール、特別教室を集約し、東西端に普通教室を配置している。1階東側に管理諸室をまとめている。

多目的ホール内の一部を廊下として利用している他、多目的ホールをコーナーとして設けている。

体育館を校舎の東側に配置し、地域利用できるようにしている。

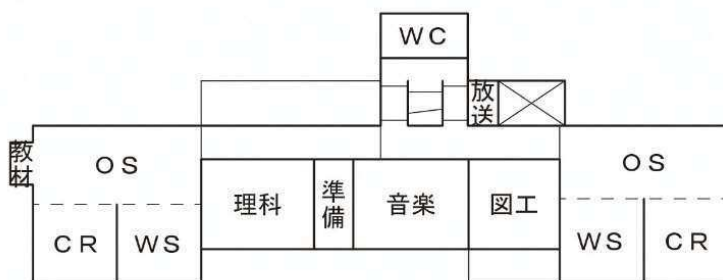

2 階 平 面



1 階 平 面

③各室・スペースの状況



普通教室



普通教室



普通教室



オープンスペース




オープンスペース



音楽室



音楽室

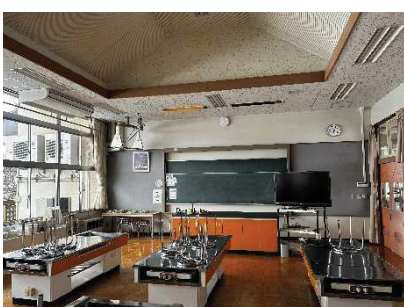

家庭科室



家庭科室




図書室



多目的ホール（ランチルーム）



昇降口

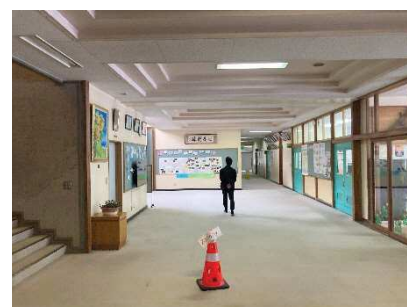

ホール




和室



アリーナ

6) 北谷地小学校

①校地の利用状況

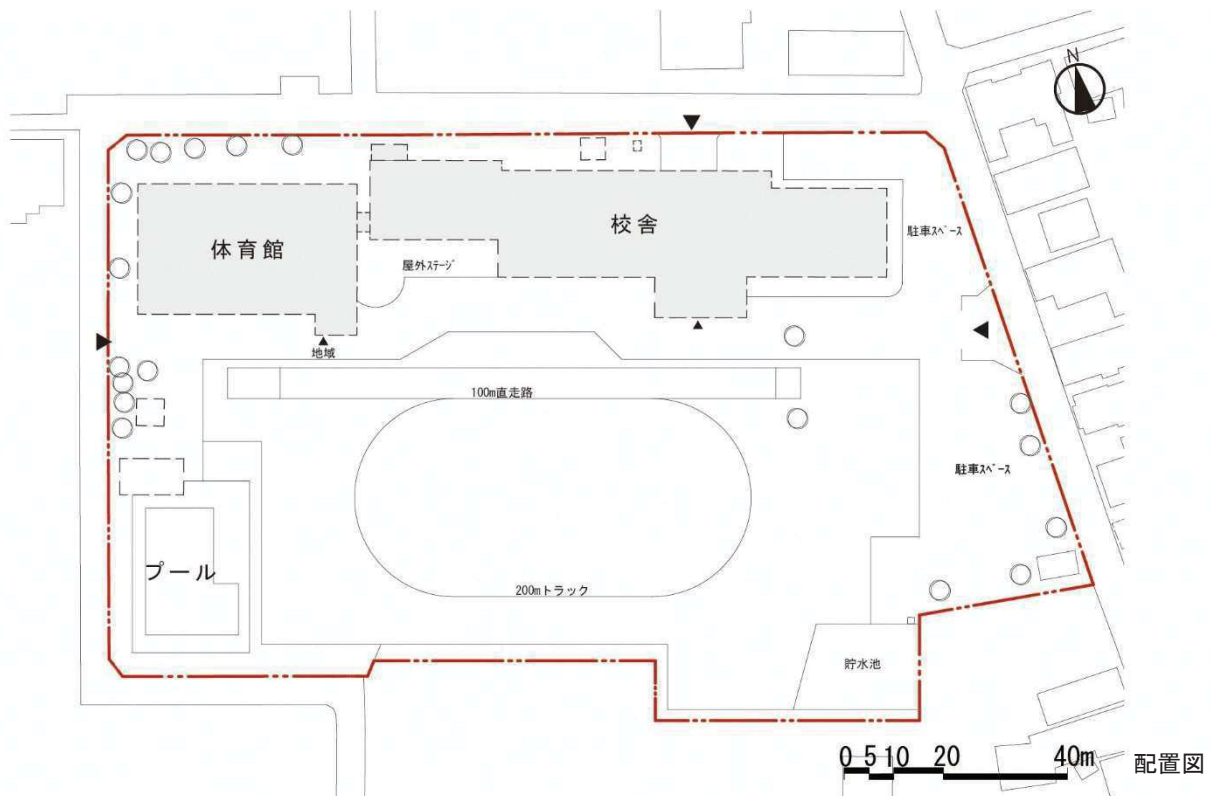

②施設構成

■特徴


2階建ての一文字型校舎の東側に3学年ごとの普通教室を配置している。

校舎の中央に昇降口を設け、1階に管理諸室、2階に特別教室をまとめている。

西側に配置した体育館と校舎との間に食堂を設けている。



2 階 平 面



1 階 平 面

③各室・スペースの状況



普通教室



普通教室



普通教室



オープンスペース



オープンスペース



オープンスペース



理科室



音楽室



音楽室




家庭科室



家庭科室



図書室

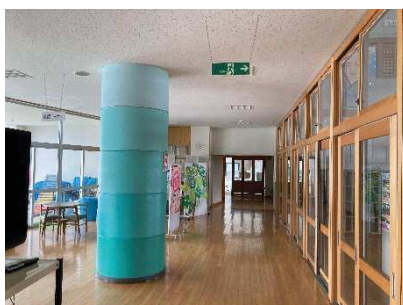

昇降口まわりの



食堂




会議室 (和室)


4. 中学校の現状

1) 河北中学校


①校地の利用状況

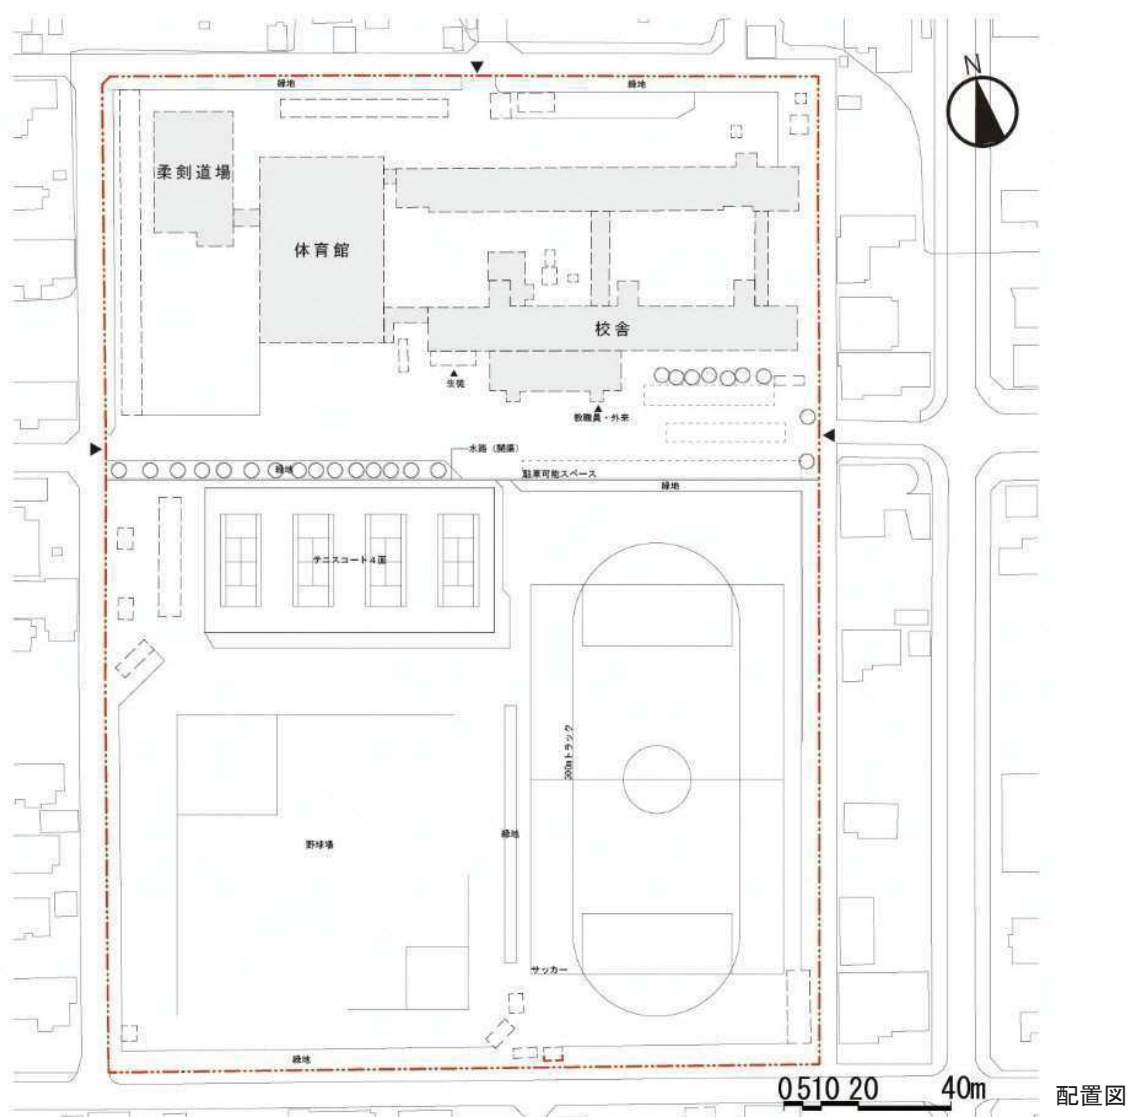


②施設構成

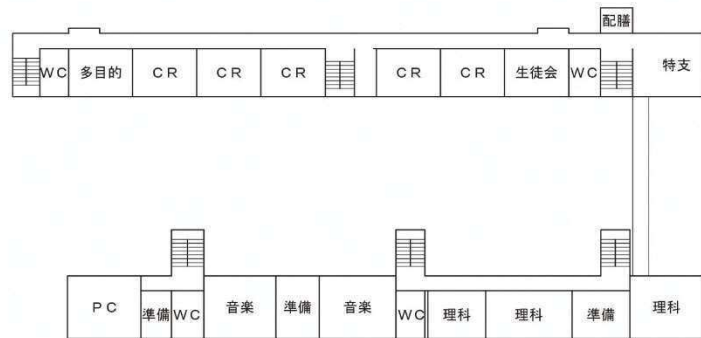

3 階 平 面

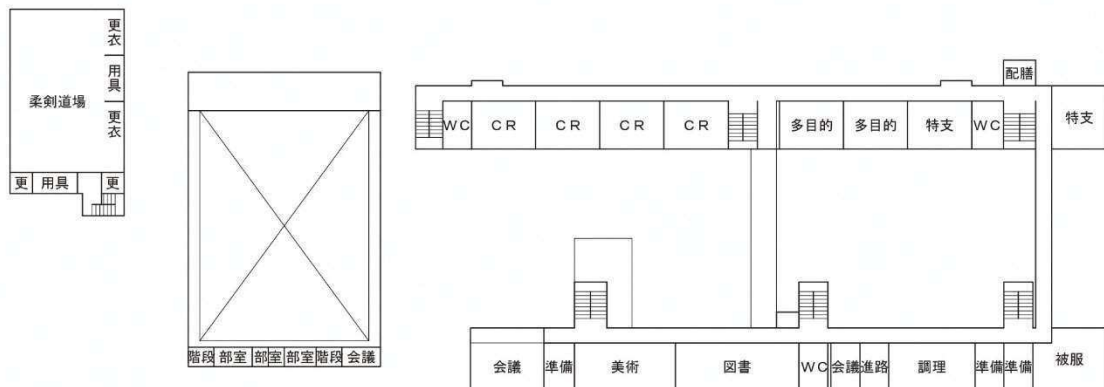

2 階 平 面

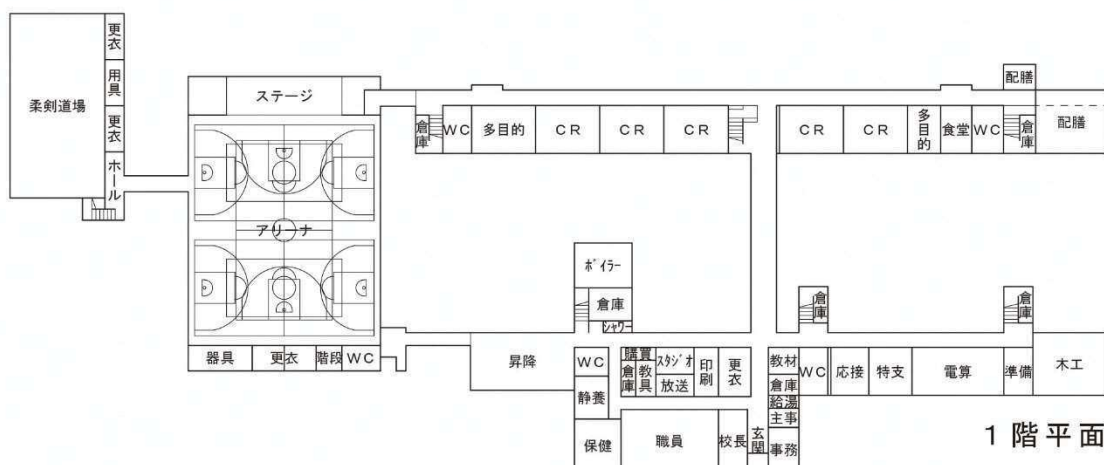

1 階 平 面

③各室・スペースの状況



昇降口



昇降口



廊下の掲示




廊下



廊下



廊下

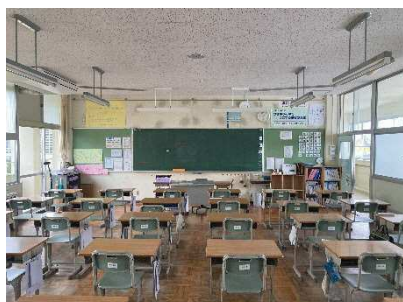

普通教室



普通教室



普通教室



普通教室前の収納



生徒会室



生徒会室



理科室



理科室



理科室



音楽室



音楽室



音楽準備室



和室



木工室



木工準備室



美術室



美術室



美術室



職員室



アリーナ



アリーナ



トイレ



トイレ



トイレ

5. 既存中学校校舎の老朽状況

- ・平成 30 年（2018 年）に、補助金を利用して内外装および設備の大規模改造工事を行っている。
- ・令和 4 年度に実施された耐力度調査における耐力度調査の結果は 5,259 点であり、危険改築の必要は認められない状況である。
- ・外装では、金属屋根や樋の腐食、金属手すり下部の腐食が見られ、金属と接触するコンクリート内部への腐食の進行が懸念される。
- ・玄関ポーチや職員室、渡り廊下などの屋根の防水劣化により、屋根の下部に塗装の膨れ、職員室まわりに雨漏りが発生している。屋根スラブ内に水が入っている可能性が高く、鉄筋の暴露によるコンクリートの落下等、危険がある。
- ・北東の増築棟との間のエキスパンション・ジョイントが劣化し、雨漏りが発生している。
- ・各室水まわりの配管が劣化しており、天井内での漏水が多発しておる。天井内には電気配線等もあるため、危険ではないかとの指摘がある。
- ・体育館の窓が割れている、開け閉めできないなどの問題が発生している。
- ・断熱が十分ではない。

⇒既存校舎を継続する場合には、改修を検討



外壁の劣化



庇・屋根の劣化による雨漏り



エキスパンションジョイント部の雨漏り



手すり等の腐食



階段窓部の結露による壁面の劣化



階段手摺端部付近の壁



金属屋根の劣化状況



特殊な窓形状により修理できず、空いたままの体育館窓

6. 放課後児童クラブの運用状況

1) 概況（第3期河北町子ども・子育て支援事業計画[令和7年3月]より抜粋）

放課後児童クラブは4か所設置されており、利用者数は増加しています。児童数は減少傾向にありますが、利用ニーズの増加から、定員数は令和4年度に250人に令和6年度には290人に見直しされています。令和3年度までは定員数に占める登録者数の割合は100%を超えていましたが、令和4年度に定員数を増やしてからは定員の8割台で推移しています。

■各クラブの運営状況（R7.4.1現在）

クラブの名称		① ちびっこ放課後西里学童クラブ				② ちびっこ放課後学童クラブ				③ さくらクラブ				④ 溝延さくらクラブ			
運営主体(名称)		ちびっこ放課後西里学童クラブ運営委員会				ちびっこ放課後学童クラブ運営委員会				学童保育所さくらクラブ運営委員会				学童保育所溝延さくらクラブ運営委員会			
事業開始年月日		平成25年2月1日				平成15年4月1日				平成12年4月1日				平成20年4月1日			
住 所		河北町西里字白山堂736-1				河北町谷地所岡2丁目5-4				河北町谷地荒町東2丁目19-11				河北町大字溝延字小堤45-1			
実 施 場 所 (施設名称等)		ちびっこ放課後西里学童クラブ (ちびっこ放課後西里学童クラブ)				ちびっこ放課後学童クラブ (ちびっこ放課後学童クラブ)				さくらクラブ (さくらクラブ)				溝延さくらクラブ (溝延さくらクラブ)			
施設(占有)面積		295.0㎡				193.78㎡				119.2㎡				225㎡			
年間 開 所 日 数		256日				251日				251日				250日			
児童受け入れ時間		平日12:00～19:30				平日10:00～19:30				平日10:30～19:00				平日10:30～19:00			
支援の単位		A	B	C※	計	A	B	計		A	B	計					
登 録 児 童 数	1年生	6			6	29		29		16		16		2			
	2年生	8			8	5	35	40		10		10		9			
	3年生	7	12	8	27	1					15	15		11			
	計	21	12	8	41	35	35	70	100%	26	15	41	67%	22	51%		
	4年生	6	15	9	30			0			6	6		7			
	5年生	1	3		4			0		1	9	10		6			
	6年生	3	6		9			0		4		4		8			
	計	10	24	9	43	0	0	0	0%	5	15	20	33%	21	49%		
	合 計	31	36	17	84	35	35	70		31	30	61		43			
職 員 数	正 規	2	2	1	5	2	2	4		3	3	6		3			
	非 常 勤	3	3	2	8	1	1	2		0		0		0			
登録児童の対象学区		西里、谷地中部、谷地西部 北谷地小学校				谷地中部小学校				谷地南部小学校				溝延小学校			
土 曜 日 等 の 開 所 関 係	土・日・祝・長期休暇等の開所状況及びその児童受入時間 (注)開所する土・日・祝・休暇等ごとに記入	土曜日7:30～19:30 学校休業日7:30～19:30				土曜日7:30～19:30 学校休業日7:30～19:30				土曜日7:30～18:00 学校休業日7:30～19:00				土曜日7:30～19:00 学校休業日7:30～19:00			

2) 各施設の運用状況と課題

放課後児童クラブの各施設は、各学区域で地域との関係を良好な関係をつくり、保護者・地域と連携協力して運営状況も良好です。

■所属児童の分布と施設規模の課題

放課後児童クラブ施設が近接していない谷地中部小学校、北谷地小学校の児童は、施設①に所属しており、施設②の施設規模が不足しているため、谷地中部小学校の1～3年生のみを受け入れており、4～6年生は施設①に所属しています。施設が近接していない小学校2校、谷地中部小学校の一部児童は、施設①の職員が車で送迎して施設①を利用しています。

本事業により小学校が統合するため、学区域は河北町全域となること、スクールバスにより学校と各地域の移動が容易になることを踏まえた総合的な判断調整が必要になります。

また、児童の分布を検討する際には、少子化傾向による児童数の減少と放課後児童クラブへのニーズ増加のバランスを考慮する必要があります。

■施設の整備費、維持管理費に関する課題

放課後児童クラブの各施設は、旧幼稚園施設を利用している施設④を除き、各施設運営事業者が整備し、維持管理をしています。施設④は、築40年の鉄骨造であり、施設の老朽化が今後の課題となります。住宅規模の各施設と比べ、整備や維持管理にかかるコスト・手間が多くなるため、小規模の施設を限られた体制で、将来は維持し続けるのが難しくなることも想定する必要があります。

施設②については、谷地中部小学校の児童数増に伴い、近年増築し定員を増やしています。

3) 各施設の運用状況

①ちびっこ放課後西里学童クラブ



ピロティ 駐車場



ピロティ 遊び場



学習スペース





学童スペース



事務スペース



置き畳スペース

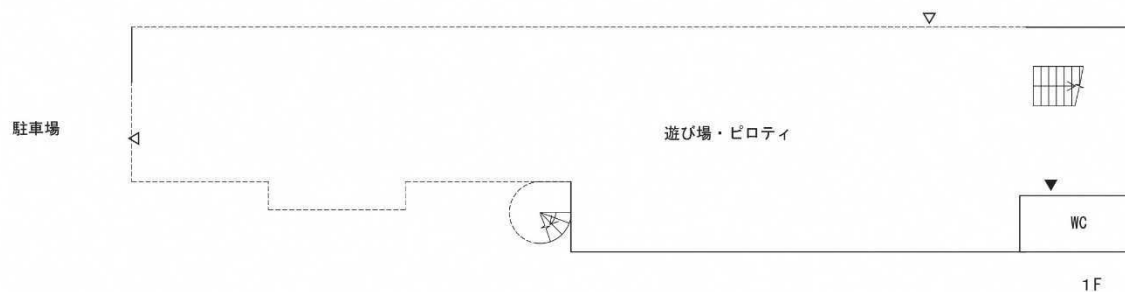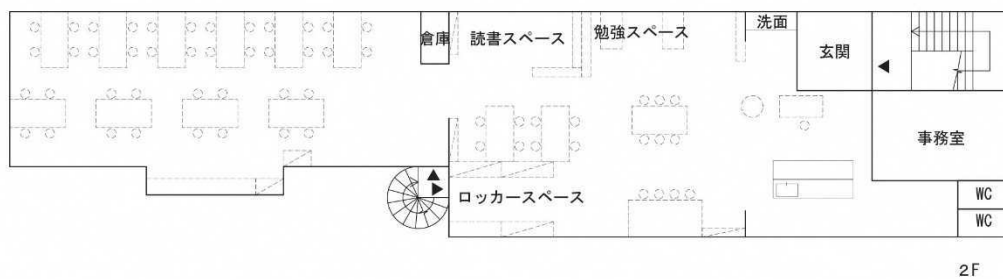

②ちびっこ放課後学童クラブ



トイレ前



プレールーム




玄関



事務スペース



浴室 前室

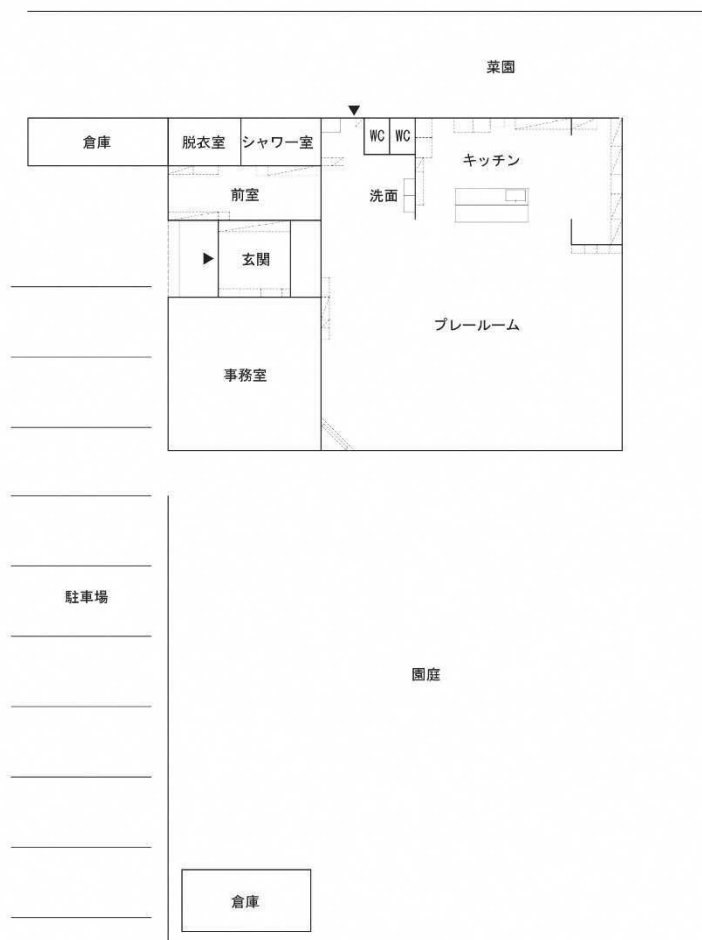

③さくらクラブ



テラス



プレールーム



プレールーム2



学習コーナー



玄関




砂場



指導員室



離れ

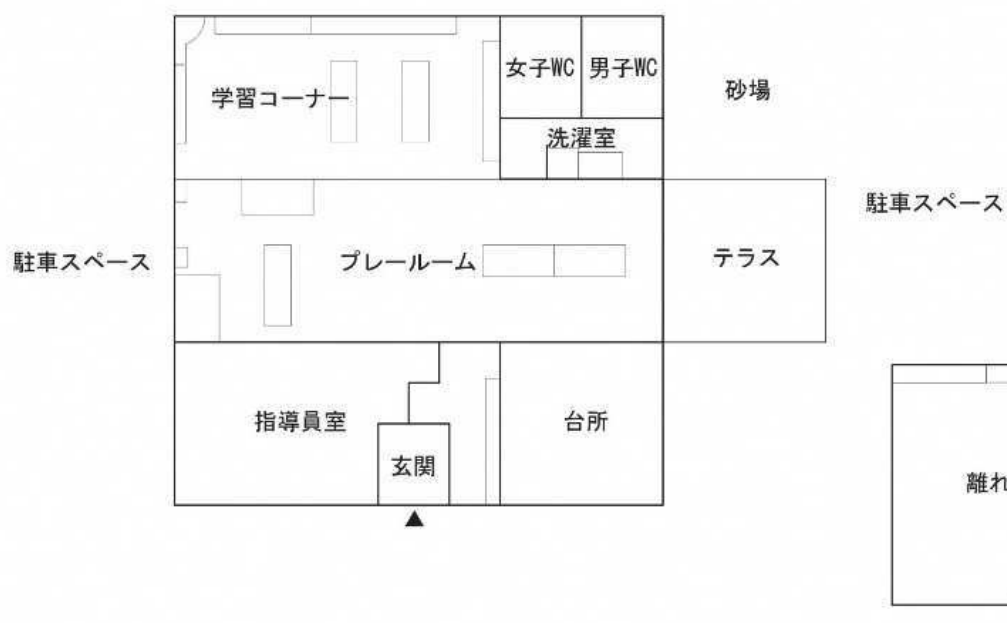

④溝延さくらクラブ

■各室・スペースの状況



学習スペース



学習スペース2



学習スペース3




玄関



手洗い、トイレ



遊戯室

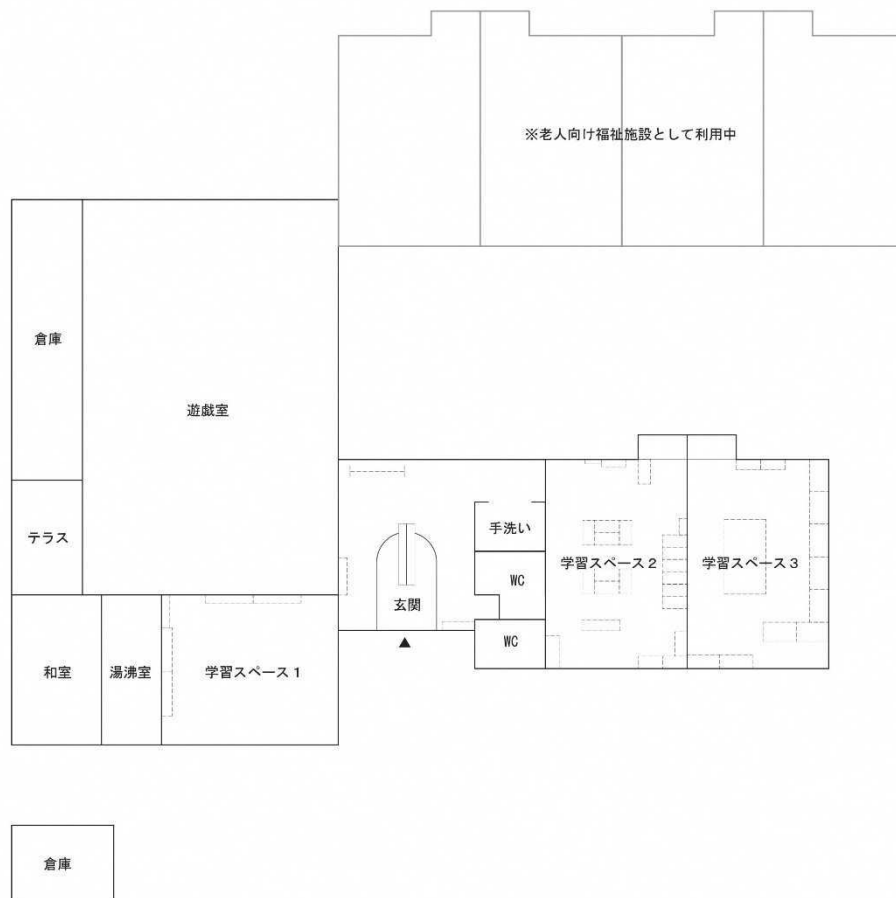

7. 給食センターの現状と課題

1) 現施設の概要

竣工年度 1988 年度 [令和 13 年度統合小学校開校時点 築 43 年]

改修増築 2005 年度 [増築 : 20.58 m²]

調理能力 2,000 食

2) 統合に伴う課題

施設一体型の小学校・中学校の校舎であり、河北町内でひとつの町立学校となるため、複数校分の給食をまとめて調理できるメリットがなくなり、別敷地で調理をする意味がなくなります。

■給食センターの現状



第 3 章 計画条件の検討

1. 計画地の検討

1) 候補地検討条件

- ①町有地であることが望ましい
- ②造成工事、地目変更等に過大な時間や費用がかからないこと
- ③安全・安心な学校生活が送れること

2) 計画位置検討の視点

①敷地面積

小学校・中学校の校舎面積を十分に確保できるか。

②通学距離

既存各校の学区からの距離について、極端な偏りが生じないか。

③安全性

水害や土砂災害の恐れがないか。

④都市計画

1 か所に小中学校がまとまるのにふさわしい位置か。

⑤その他

財政他、町民への負担が大きくなるか。

3) 計画候補地の検討

河北町立小中学校整備検討委員会における、最も広い土地を選定すべきであるという意見を踏まえ、次頁の候補地カルテにより、敷地面積、通学距離、安全性、都市計画、その他の5つの視点で用地の評価を行い、総合的に検討し、下記の2候補地について、整備方法、整備スケジュール等をあわせて検討し、候補地を決定するものとなりました。

候補地 07 河北中学校校地

候補地 08-① サハトベに花隣接地


4) 敷地の候補地カルテ

■用地選定の評価項目と評価基準



評価分野	評価項目		評価の考え方	評価基準		
				◎	○	-
敷地面積	1-1	面積	敷地面積が想定される必要面積以上か	50,000 m ² 以上	25,000 m ² 以上 50,000 m ² 未満	25,000 m ² 未満
通学距離	2-1	通学距離	町の中心部（役場）からの直線距離	2km 未満	2km 以上 4km 未満	4km 以上
	2-2	通学距離（最大）	小学校間最大距離	3km 未満	2km 以上 4km 未満	4km 以上
安全性	3-1	浸水想定区域	浸水の危険がないか	浸水想定 区域外	0.5m 未満	0.5m 以上
	3-2	土砂災害警戒区域	土砂災害の危険がないか	区域外		区域内
	3-3	ため池洪水想定区域	ため池洪水の危険がないか	区域外		区域内
	3-4	環境	周辺に通学や学習環境に影響のある 施設等があるか	500m 以内に無		有
都市計画	4-1	将来都市構造	河北都市計画マスタープランの まちなかエリア	内		外
	4-2	公園	最寄りの都市公園までの距離	500m 以内	500m 以上 1km 未満	1km 以上
	4-3	生涯学習施設・ 体育施設	最寄りの生涯学習施設・社会体育 施設までの距離	500m 以内	500m 以上 1km 未満	1km 以上
その他	5-1	町有地	町有地であるかどうか	町有地		私有地
	5-2	計画区域	区域区分	用途区域	都市計画区域	農業振興地域

候補地 1：西里小学校校地

評価分野	評価項目		考え方	詳細	評価
敷地面積	1-1	面積	敷地面積が想定される必要面積以上か	18,686 m ²	-
通学距離	2-1	通学距離	町の中心部（役場）からの直線距離	3.0km	○
	2-2	通学距離（最大）	小学校間最大距離	4.2km	-
安全性	3-1	浸水想定区域	浸水の危険がないか	浸水想定区域外	◎
	3-2	土砂災害警戒区域	土砂災害の危険がないか	区域外	◎
	3-3	ため池洪水想定区域	ため池洪水の危険がないか	区域外	◎
	3-4	環境	周辺に通学や学習環境に影響のある施設等があるか	無	◎
都市計画	4-1	将来都市構造	河北都市計画マスタープランのまちなかエリア	外	-
	4-2	公園	最寄りの都市公園までの距離	嶋田地公園 1.5km	-
	4-3	生涯学習施設・体育施設	最寄りの生涯学習施設・社会体育施設までの距離	西里農村環境改善センター 300m	◎
その他	5-1	町有地	町有地であるかどうか	町有地	◎
	5-2	計画区域	区域区分	都市計画区域	○

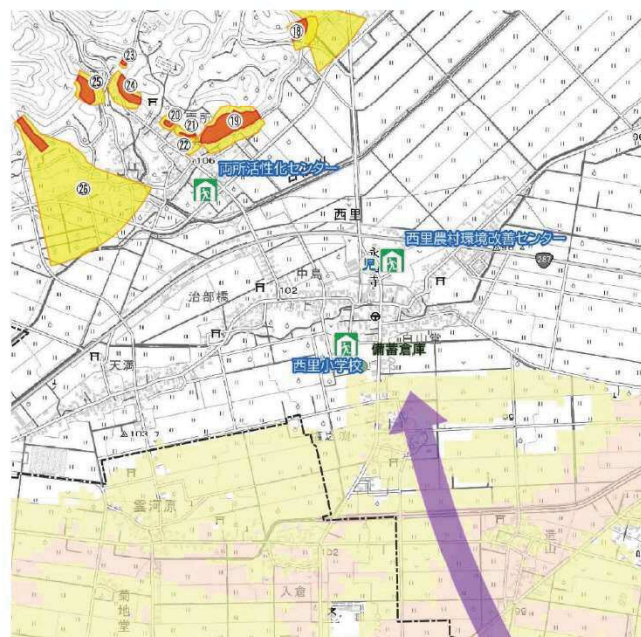


■河北町防災ハザードマップ

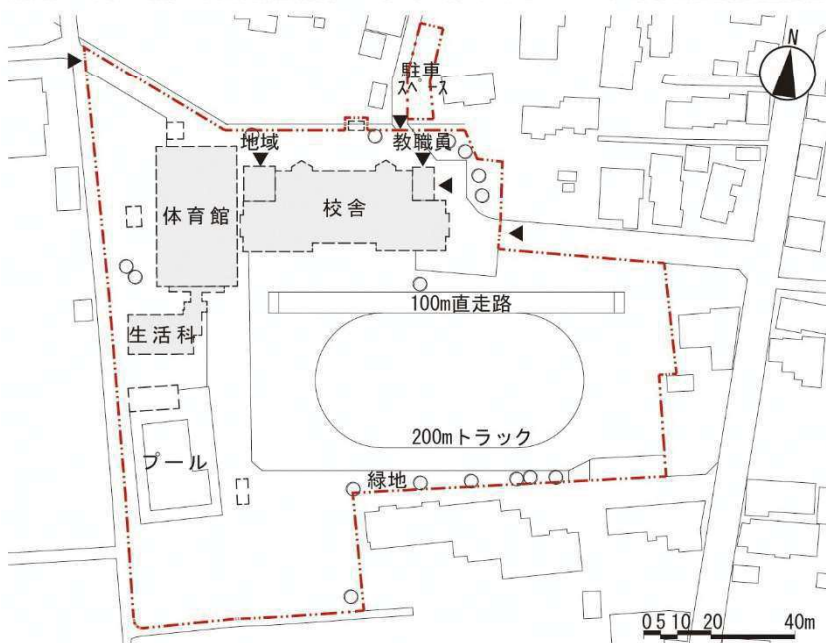
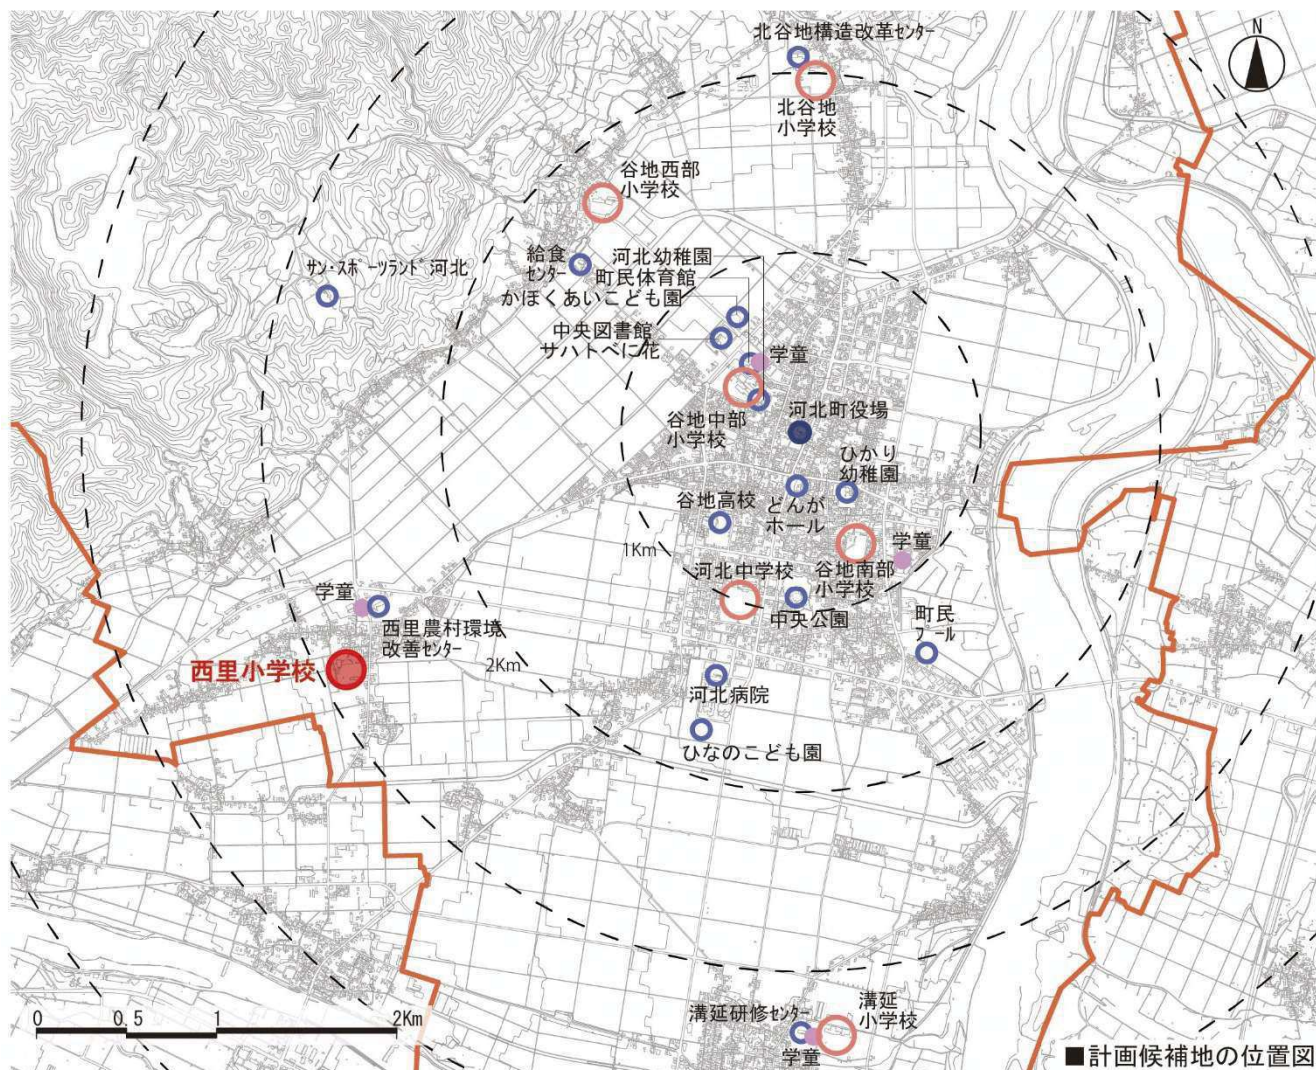


候補地２：溝延小学校校地

評価分野	評価項目		考え方	詳細	評価
敷地面積	1-1	面積	敷地面積が想定される必要面積以上か	19,932 m ²	-
通学距離	2-1	通学距離	町の中心部（役場）からの直線距離	4.0km	-
	2-2	通学距離（最大）	小学校間最大距離	5.3km	-
安全性	3-1	浸水想定区域	浸水の危険がないか	0.5m 以上	-
	3-2	土砂災害警戒区域	土砂災害の危険がないか	区域外	◎
	3-3	ため池洪水想定区域	ため池洪水の危険がないか	区域外	◎
	3-4	環境	周辺に通学や学習環境に影響のある施設等があるか	無	◎
都市計画	4-1	将来都市構造	河北都市計画マスタープランのまちなかエリア	外	-
	4-2	公園	最寄りの都市公園までの距離	溝延本丸公園 400m	◎
	4-3	生涯学習施設・体育施設	最寄りの生涯学習施設・社会体育施設までの距離	溝延研修センター 100m	◎
その他	5-1	町有地	町有地であるかどうか	町有地	◎
	5-2	計画区域	区域区分	都市計画区域	○


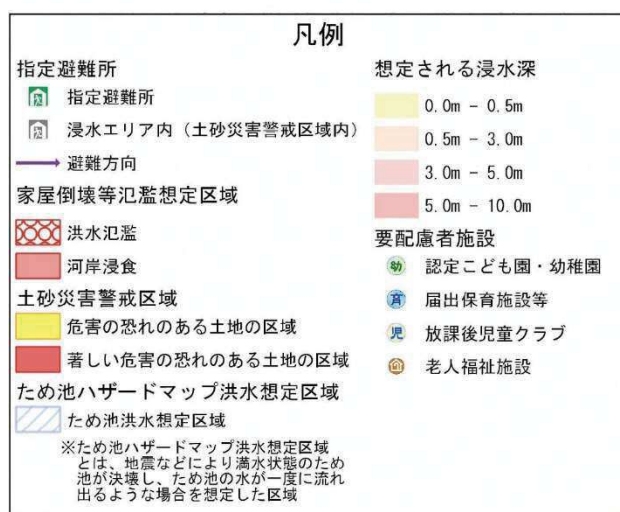




■河北町防災ハザードマップ

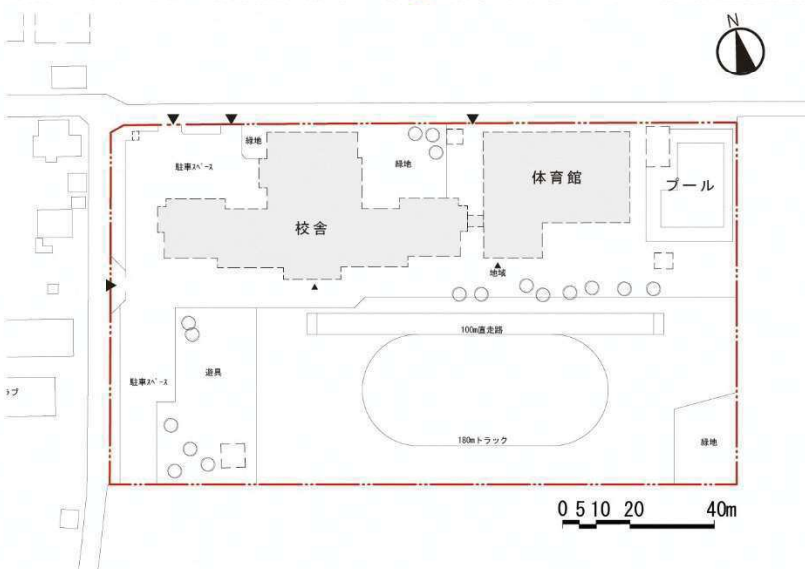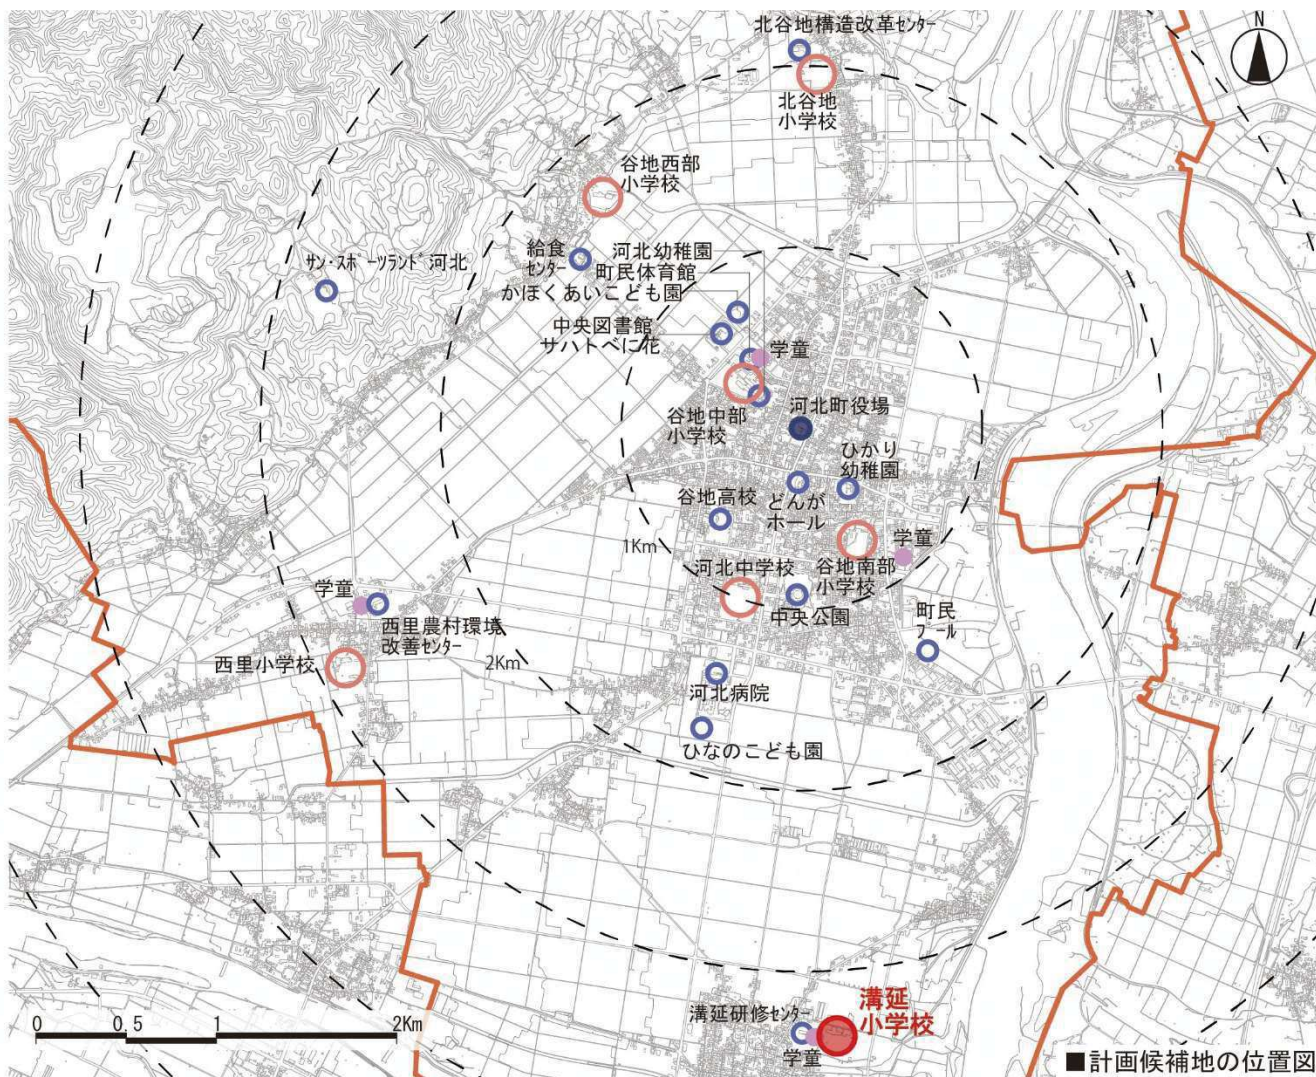

候補地 3 : 谷地中部小学校校地



評価分野	評価項目		考え方	詳細	評価
敷地面積	1-1	面積	敷地面積が想定される必要面積以上か	27,874 m ²	○
通学距離	2-1	通学距離	町の中心部（役場）からの直線距離	1.0km	◎
	2-2	通学距離（最大）	小学校間最大距離	3.6km	○
安全性	3-1	浸水想定区域	浸水の危険がないか	浸水想定区域外	◎
	3-2	土砂災害警戒区域	土砂災害の危険がないか	区域外	◎
	3-3	ため池洪水想定区域	ため池洪水の危険がないか	区域外	◎
	3-4	環境	周辺に通学や学習環境に影響のある施設等があるか	無	◎
都市計画	4-1	将来都市構造	河北都市計画マスタープランのまちなかエリア	内	◎
	4-2	公園	最寄りの都市公園までの距離	所岡中部公園 150m	◎
	4-3	生涯学習施設・体育施設	最寄りの生涯学習施設・社会体育施設までの距離	町民体育館 50m	◎
その他	5-1	町有地	町有地であるかどうか	町有地	◎
	5-2	計画区域	区域区分	用途区域	◎

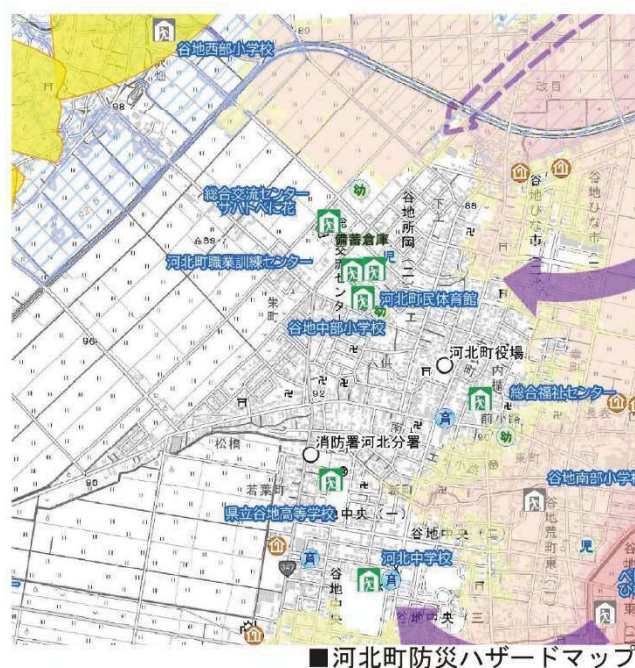
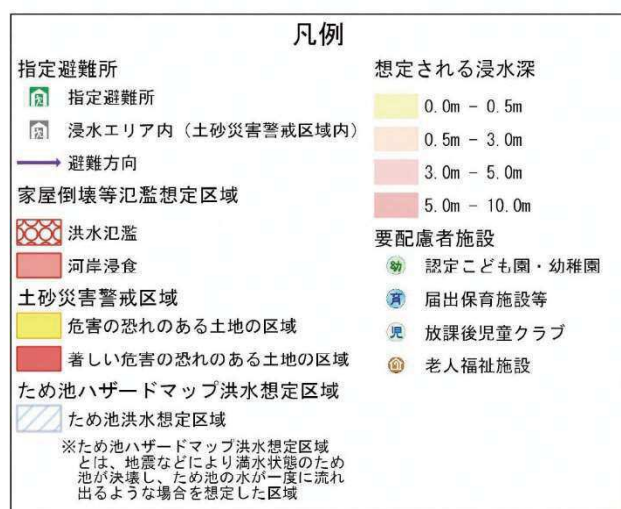


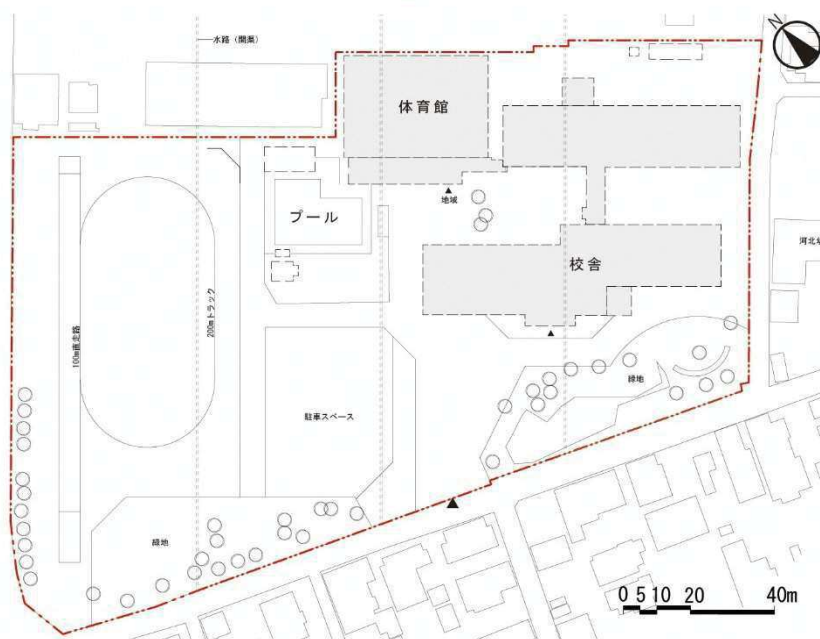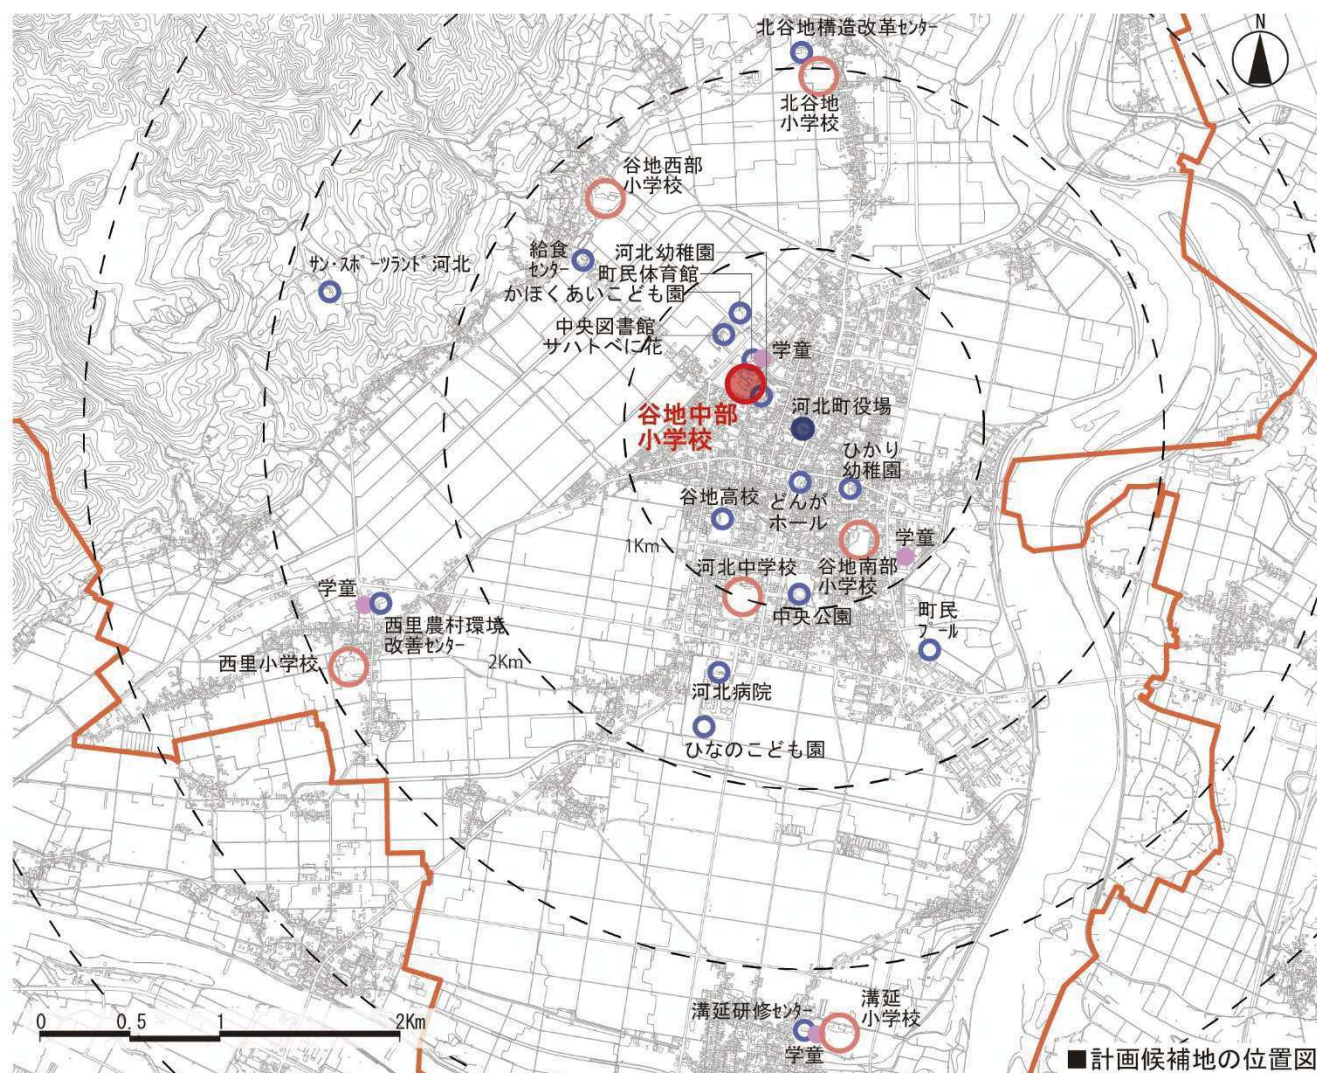

候補地 4：谷地南部小学校校地



評価分野	評価項目		考え方	詳細	評価
敷地面積	1-1	面積	敷地面積が想定される必要面積以上か	22,855 m ²	-
通学距離	2-1	通学距離	町の中心部（役場）からの直線距離	1.0km	◎
	2-2	通学距離（最大）	小学校間最大距離	2.7km	◎
安全性	3-1	浸水想定区域	浸水の危険がないか	0.5m 以上	-
	3-2	土砂災害警戒区域	土砂災害の危険がないか	区域外	◎
	3-3	ため池洪水想定区域	ため池洪水の危険がないか	区域外	◎
	3-4	環境	周辺に通学や学習環境に影響のある施設等があるか	無	◎
都市計画	4-1	将来都市構造	河北都市計画マスタープランのまちなかエリア	内	◎
	4-2	公園	最寄りの都市公園までの距離	荒町東公園 200m	◎
	4-3	生涯学習施設・体育施設	最寄りの生涯学習施設・社会体育施設までの距離	町民プール 500m	○
その他	5-1	町有地	町有地であるかどうか	町有地	◎
	5-2	計画区域	区域区分	用途区域	◎

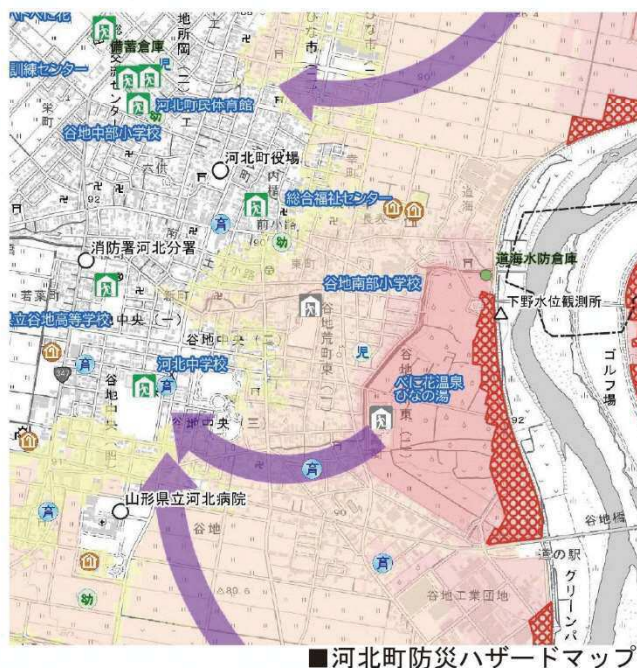
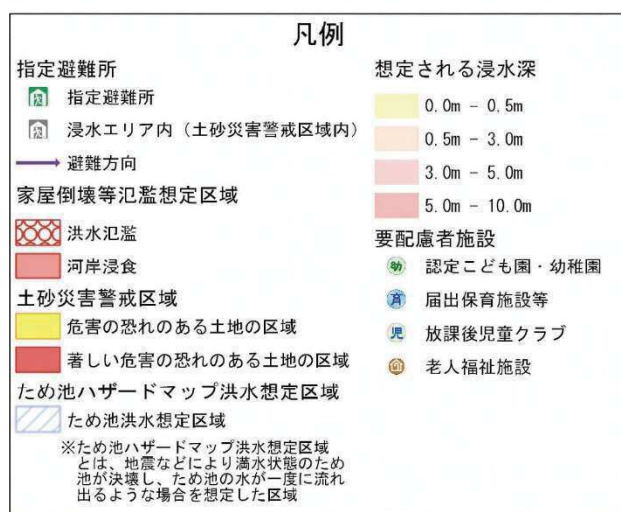


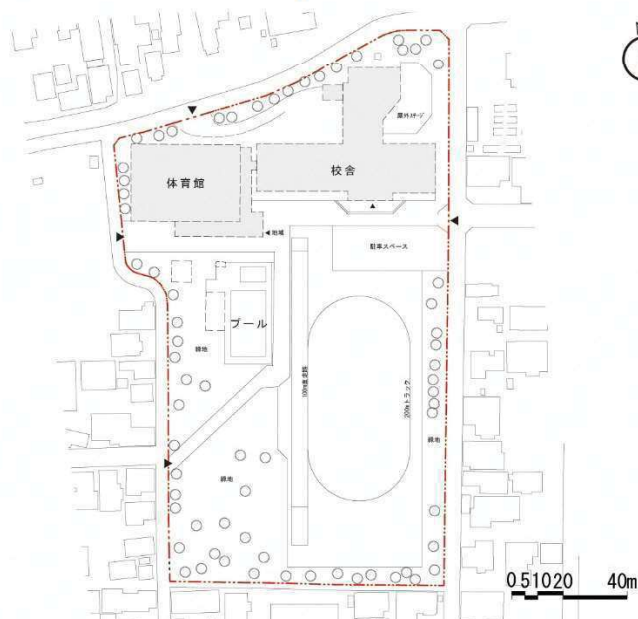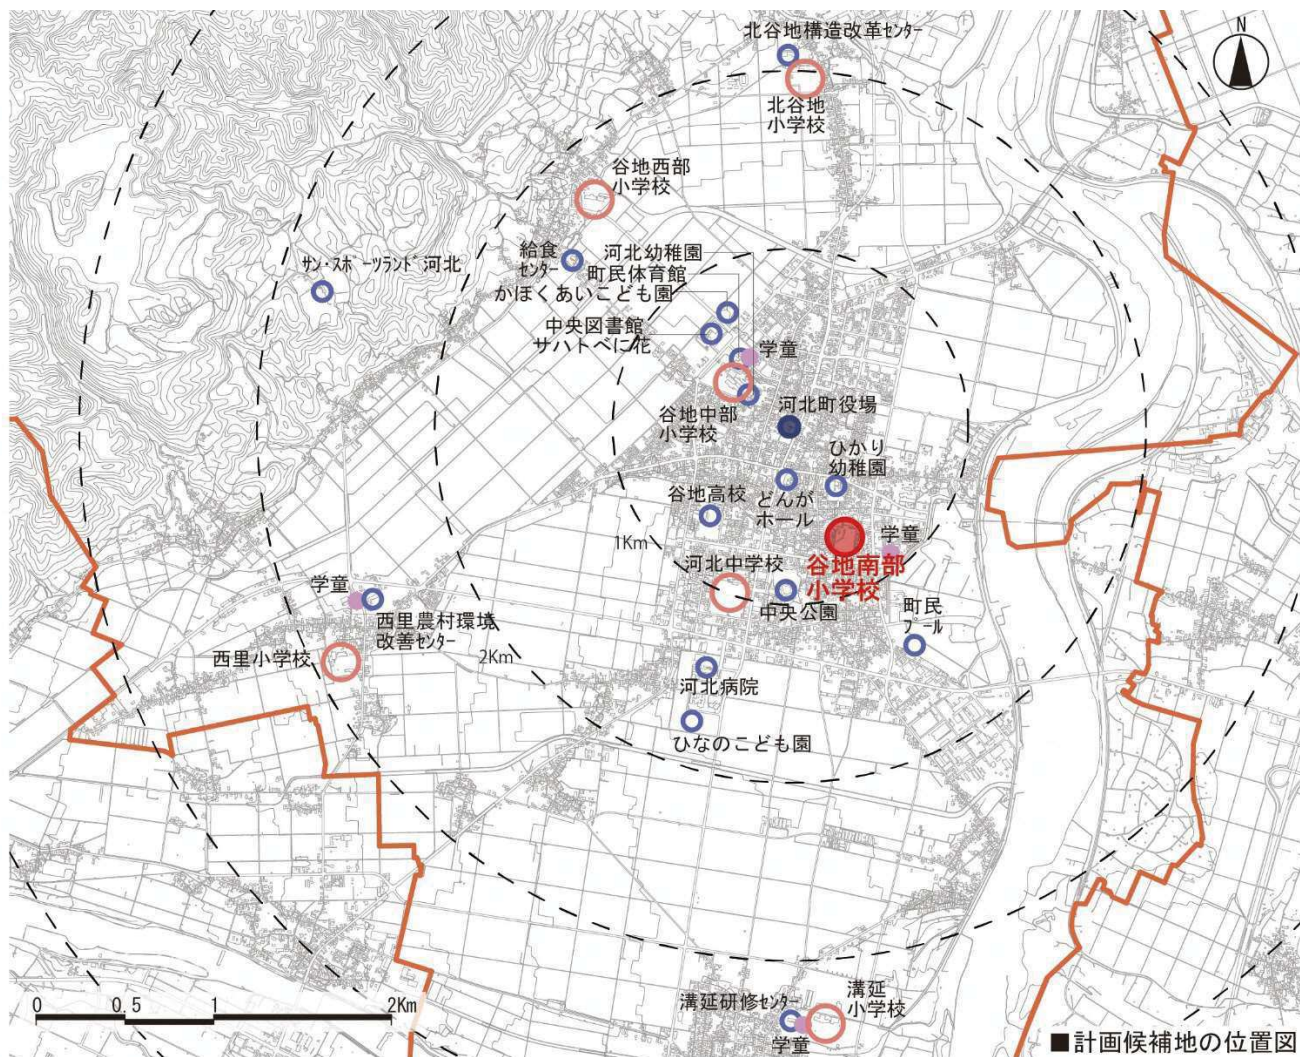

候補地５：谷地西部小学校校地



評価分野	評価項目		候補５ 考え方	詳細	評価
敷地面積	1-1	面積	敷地面積が想定される必要面積以上か	12,577 m ²	-
通学距離	2-1	通学距離	町の中心部（役場）からの直線距離	2.0km	◎
	2-2	通学距離（最大）	小学校間最大距離	4.8km	-
安全性	3-1	浸水想定区域	浸水の危険がないか	浸水想定区域外	◎
	3-2	土砂災害警戒区域	土砂災害の危険がないか	区域内	-
	3-3	ため池洪水想定区域	ため池洪水の危険がないか	区域内	-
	3-4	環境	周辺に通学や学習環境に影響のある施設等があるか	無	◎
都市計画	4-1	将来都市構造	河北都市計画マスタープランのまちなかエリア	外	-
	4-2	公園	最寄りの都市公園までの距離	所岡中部公園 1km	-
	4-3	生涯学習施設・体育施設	最寄りの生涯学習施設・社会体育施設までの距離	サハトベに花 900m	○
その他	5-1	町有地	町有地であるかどうか	町有地	◎
	5-2	計画区域	区域区分	都市計画区域	○

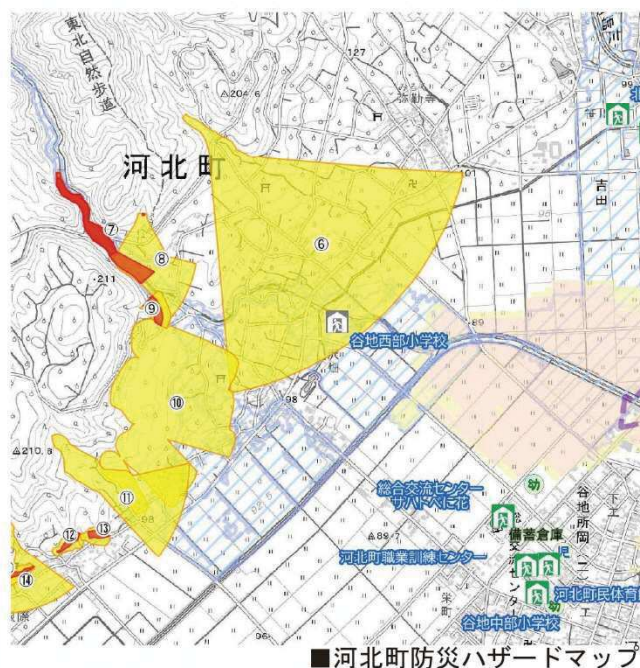
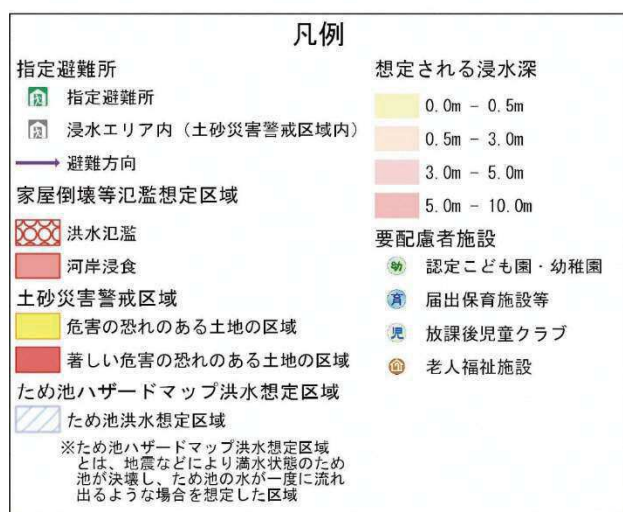


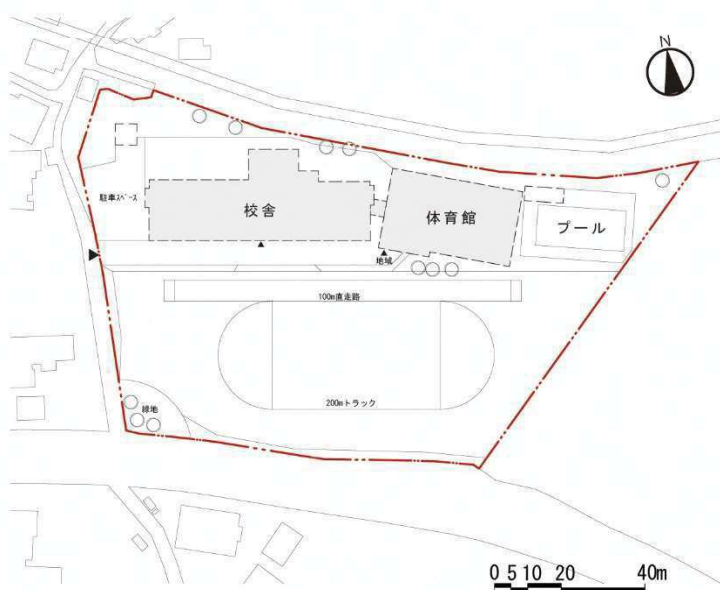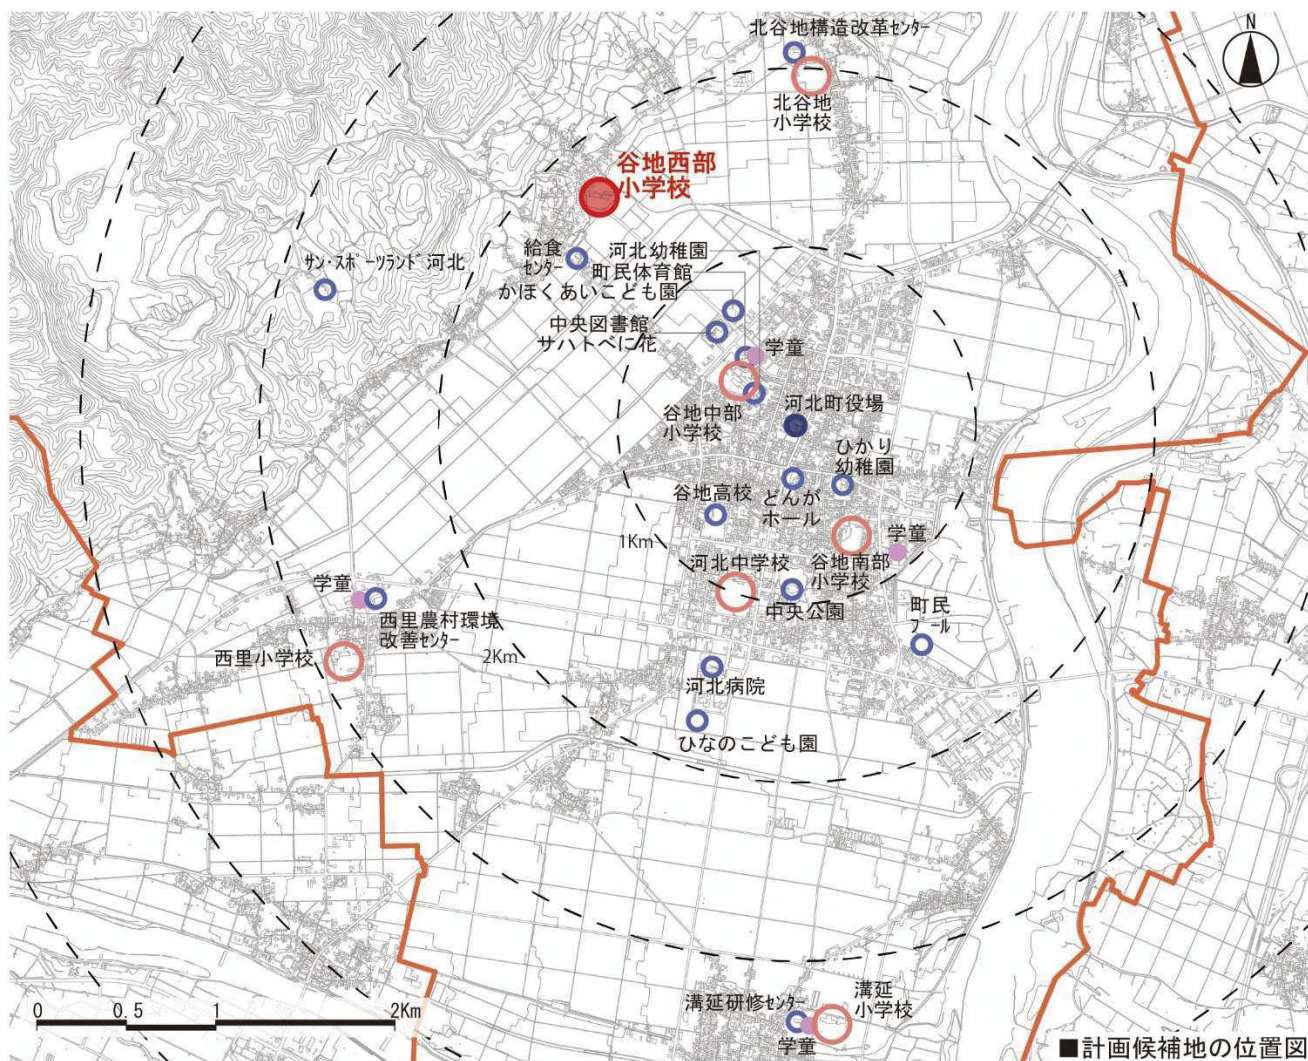

候補地 6：北谷地小学校校地


評価分野	評価項目		考え方	詳細	評価
敷地面積	1-1	面積	敷地面積が想定される必要面積以上か	19,458 m ²	-
通学距離	2-1	通学距離	町の中心部（役場）からの直線距離	2.0km	◎
	2-2	通学距離（最大）	小学校間最大距離	5.3km	-
安全性	3-1	浸水想定区域	浸水の危険がないか	浸水想定区域外	◎
	3-2	土砂災害警戒区域	土砂災害の危険がないか	区域外	◎
	3-3	ため池洪水想定区域	ため池洪水の危険がないか	区域内	-
	3-4	環境	周辺に通学や学習環境に影響のある施設等があるか	無	◎
都市計画	4-1	将来都市構造	河北都市計画マスタープランのまちなかエリア	外	-
	4-2	公園	最寄りの都市公園までの距離	所岡東公園 1.3km	-
	4-3	生涯学習施設・体育施設	最寄りの生涯学習施設・社会体育施設までの距離	北谷地構造改善センター 20m	◎
その他	5-1	町有地	町有地であるかどうか	町有地	◎
	5-2	計画区域	区域区分	都市計画区域	○

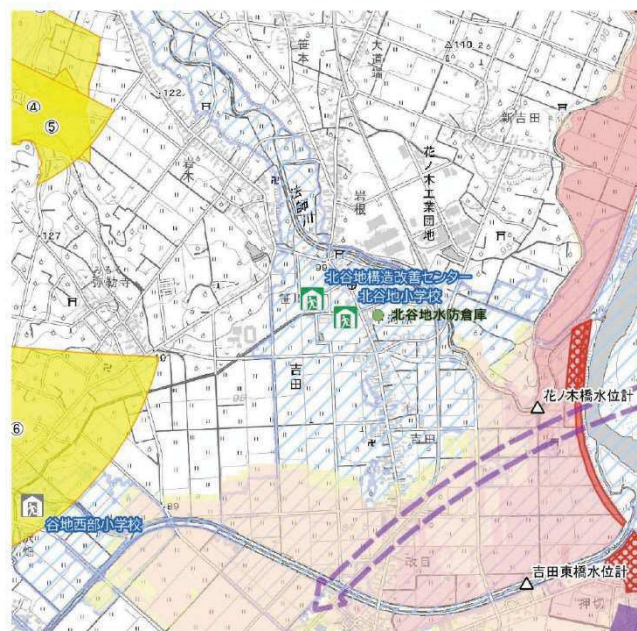
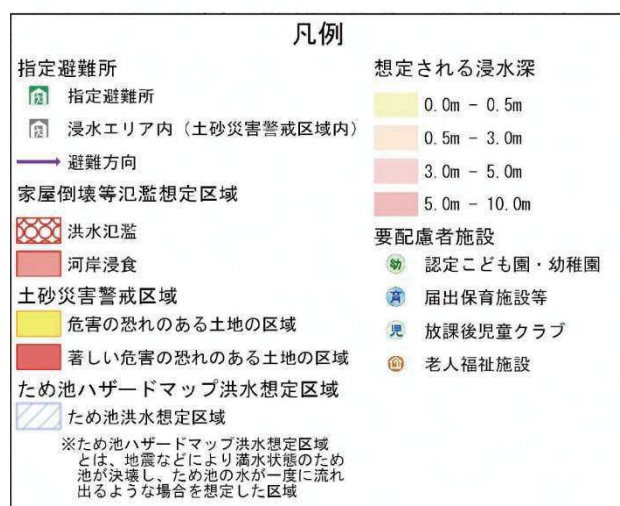


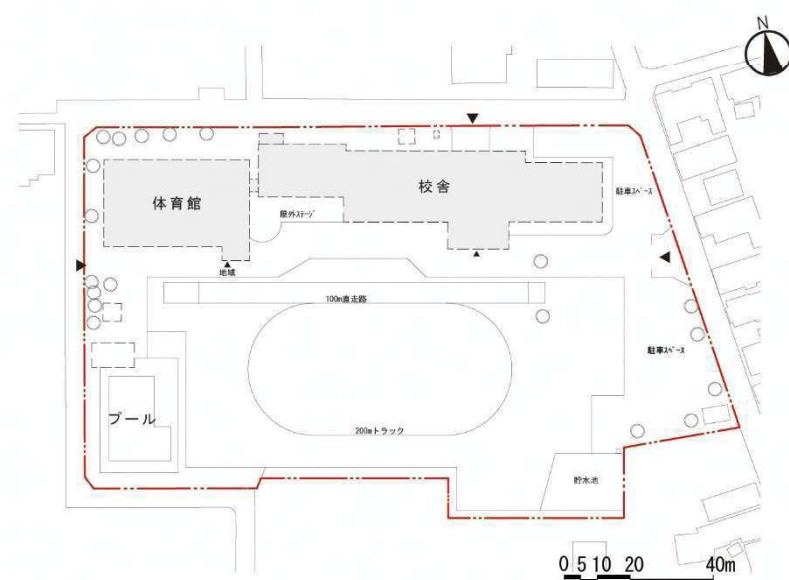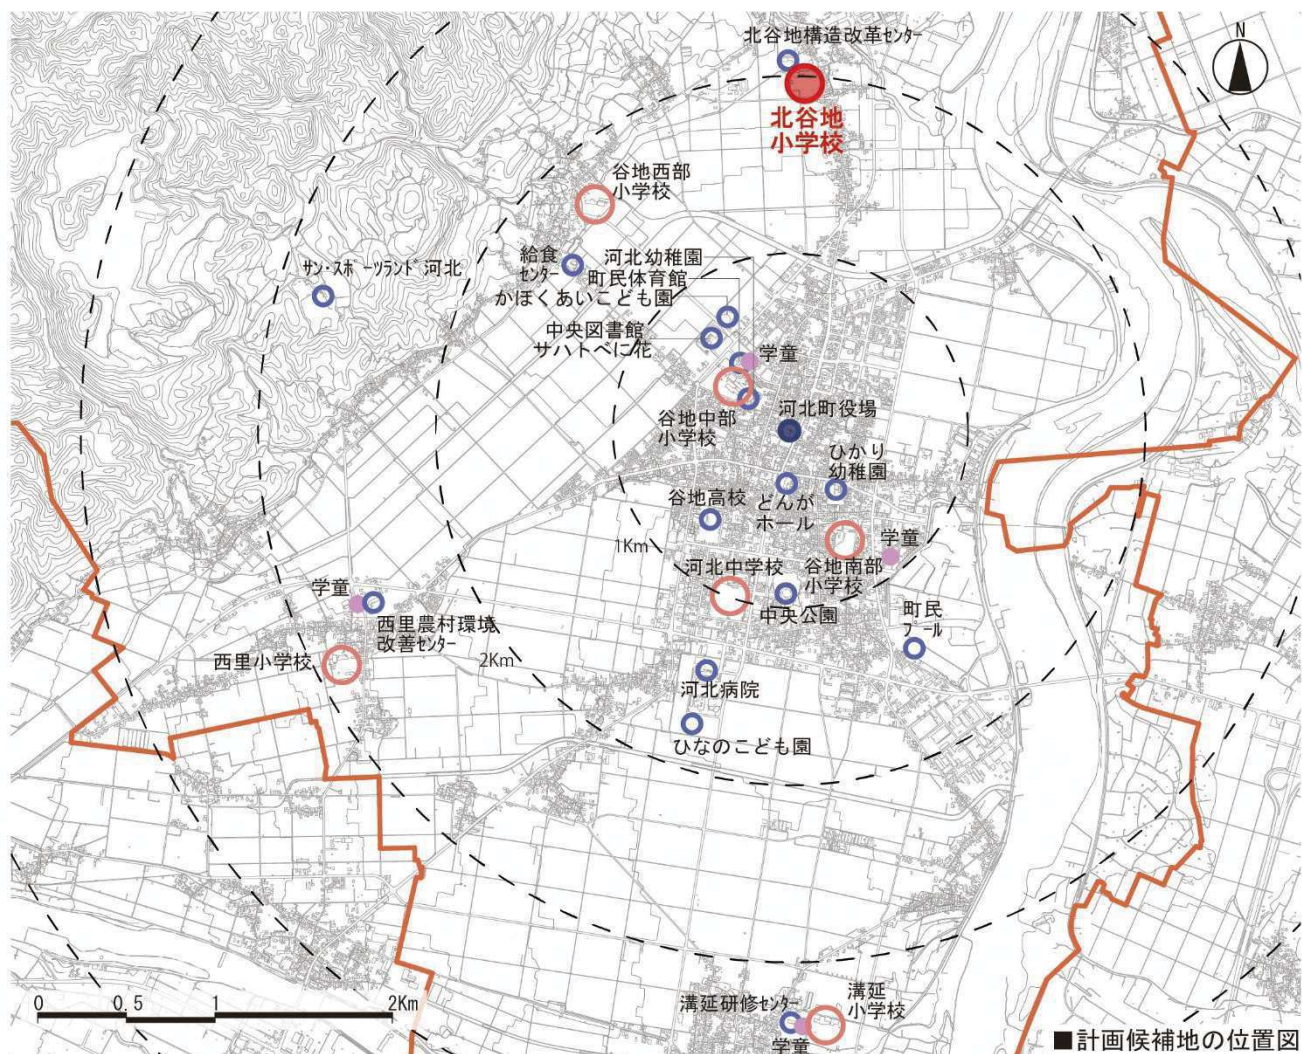

候補地 7：河北中学校校地



評価分野	評価項目		考え方	詳細	評価
敷地面積	1-1	面積	敷地面積が想定される必要面積以上か	51,762 m ²	◎
通学距離	2-1	通学距離	町の中心部（役場）からの直線距離	1.0km	◎
	2-2	通学距離（最大）	小学校間最大距離	2.9km	◎
安全性	3-1	浸水想定区域	浸水の危険がないか	浸水想定区域外	◎
	3-2	土砂災害警戒区域	土砂災害の危険がないか	区域外	◎
	3-3	ため池洪水想定区域	ため池洪水の危険がないか	区域外	◎
	3-4	環境	周辺に通学や学習環境に影響のある施設等があるか	無	◎
都市計画	4-1	将来都市構造	河北都市計画マスタープランのまちなかエリア	内	◎
	4-2	公園	最寄りの都市公園までの距離	中央公園 100m	◎
	4-3	生涯学習施設・体育施設	最寄りの生涯学習施設・社会体育施設までの距離	町民プール 900m	○
その他	5-1	町有地	町有地であるかどうか	町有地	◎
	5-2	計画区域	区域区分	用途区域	◎

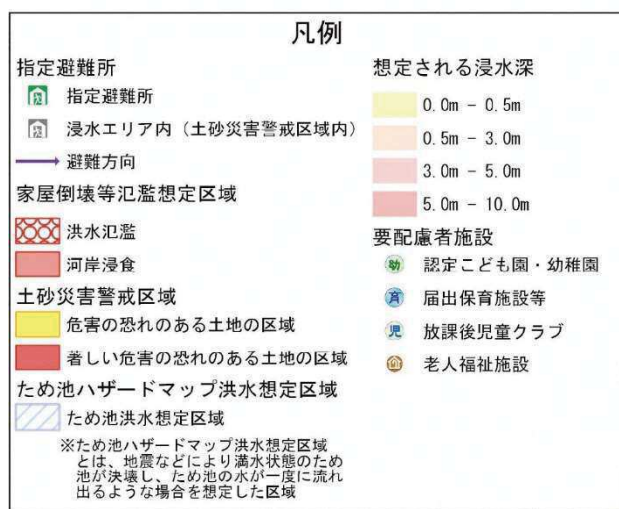

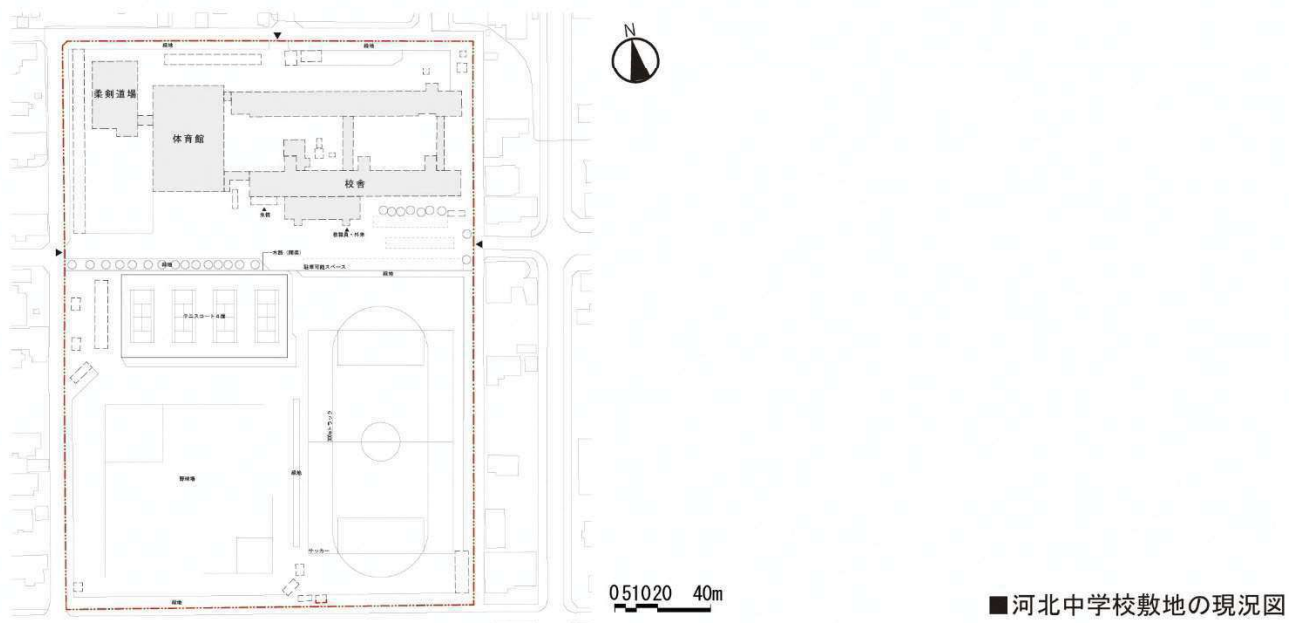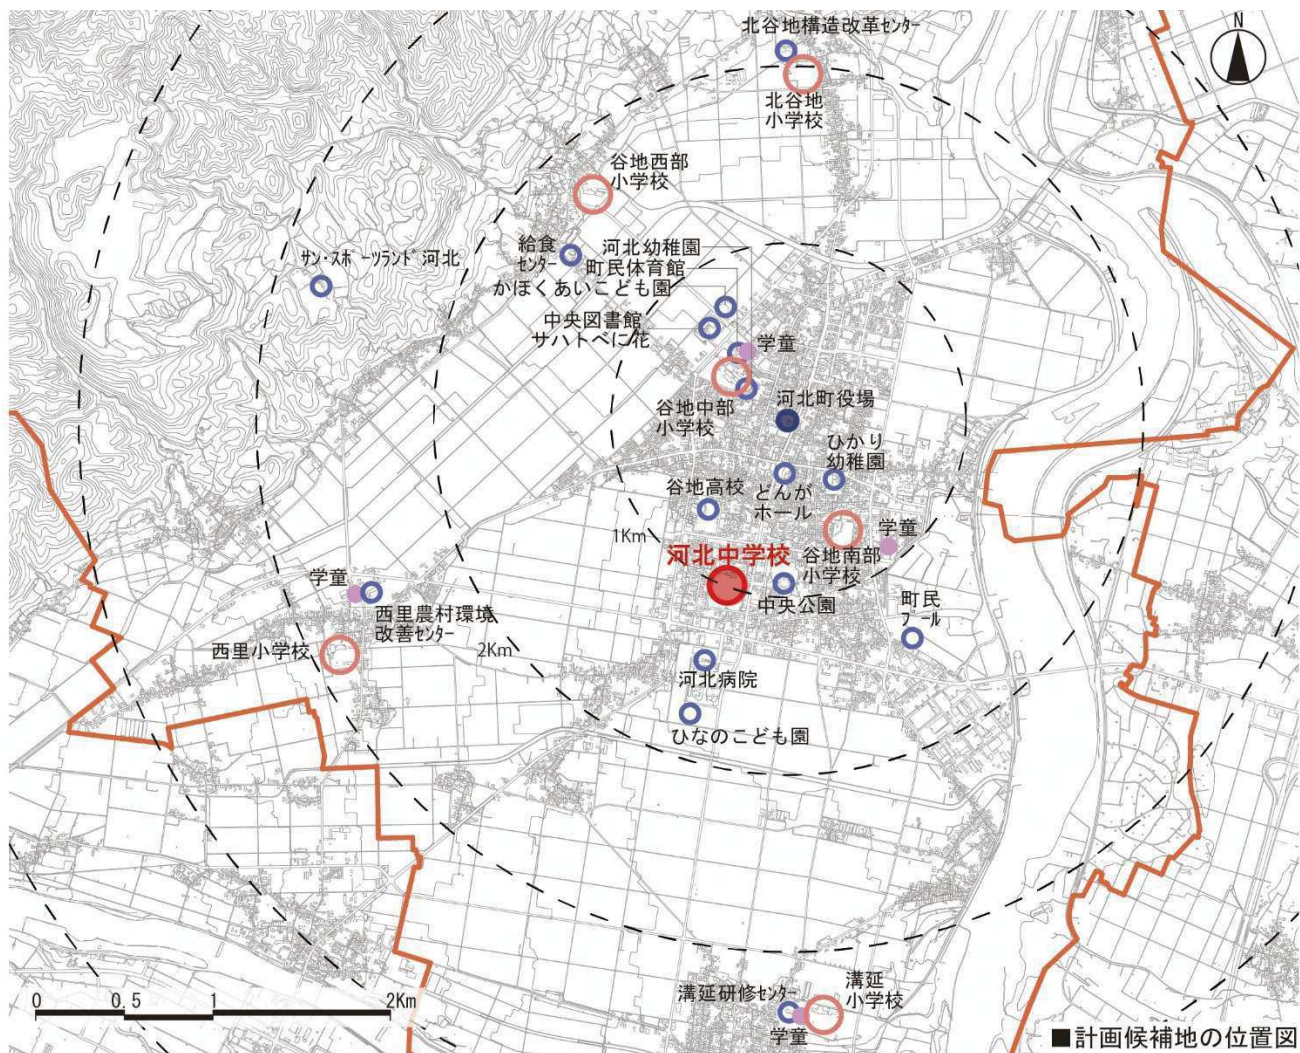



候補地 8 : サハトベに花北側

評価分野	評価項目		候補 8 考え方	詳細	評価
敷地面積	1-1	面積	敷地面積が想定される必要面積以上か	50,000 m ² 以上可	◎
通学距離	2-1	通学距離	町の中心部（役場）からの直線距離	1.0km	◎
	2-2	通学距離（最大）	小学校間最大距離	3.9km	○
安全性	3-1	浸水想定区域	浸水の危険がないか	浸水想定区域外	◎
	3-2	土砂災害警戒区域	土砂災害の危険がないか	区域外	◎
	3-3	ため池洪水想定区域	ため池洪水の危険がないか	区域外	◎
	3-4	環境	周辺に通学や学習環境に影響のある施設等があるか	無	◎
都市計画	4-1	将来都市構造	河北都市計画マスタープランのまちなかエリア	外	-
	4-2	公園	最寄りの都市公園までの距離	所岡中部公園 200m	◎
	4-3	生涯学習施設・体育施設	最寄りの生涯学習施設・社会体育施設までの距離	サハトベに花 50m	◎
その他	5-1	町有地	町有地であるかどうか	私有地	-
	5-2	計画区域	区域区分	農業振興地域	-

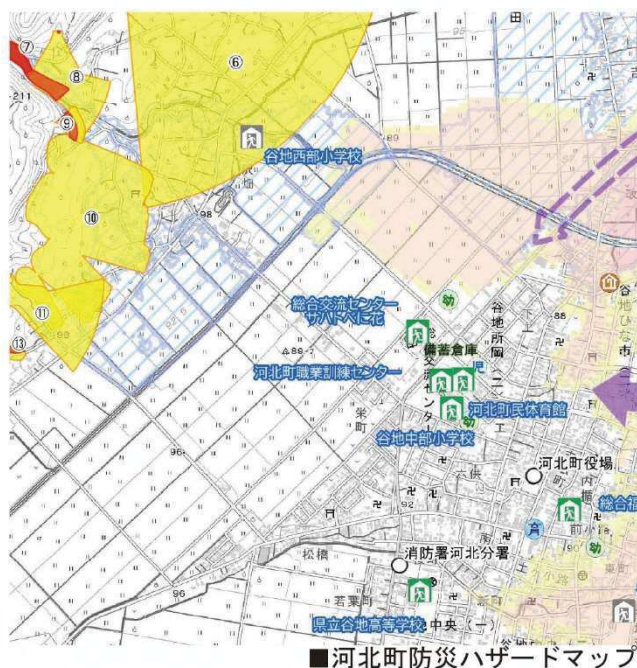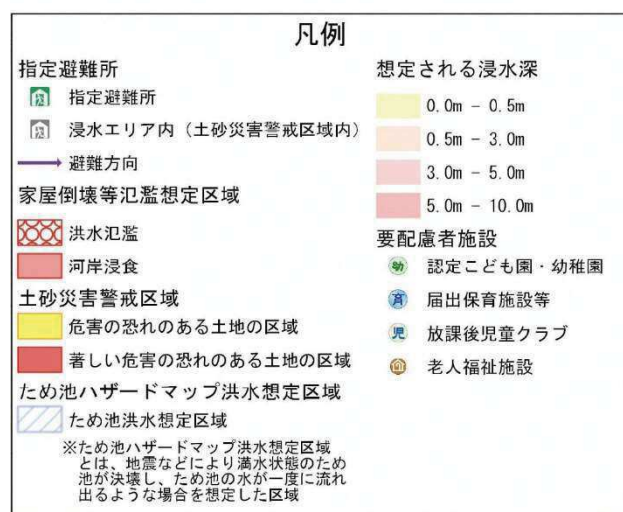


候補地 9：谷地高校西側

評価分野	評価項目		考え方	詳細	評価
敷地面積	1-1	面積	敷地面積が想定される必要面積以上か	50,000 m ² 以上可	◎
通学距離	2-1	通学距離	町の中心部（役場）からの直線距離	2.0km	◎
	2-2	通学距離（最大）	小学校間最大距離	3.2km	○
安全性	3-1	浸水想定区域	浸水の危険がないか	浸水想定区域外	◎
	3-2	土砂災害警戒区域	土砂災害の危険がないか	区域外	◎
	3-3	ため池洪水想定区域	ため池洪水の危険がないか	区域外	◎
	3-4	環境	周辺に通学や学習環境に影響のある施設等があるか	パチンコ店、R287	-
都市計画	4-1	将来都市構造	河北都市計画マスタープランのまちなかエリア	外	-
	4-2	公園	最寄りの都市公園までの距離	若葉公園 500m	◎
	4-3	生涯学習施設・体育施設	最寄りの生涯学習施設・社会体育施設までの距離	西里農村環境改善センター 1.3km	-
その他	5-1	町有地	町有地であるかどうか	私有地	-
	5-2	計画区域	区域区分	農業振興地域	-

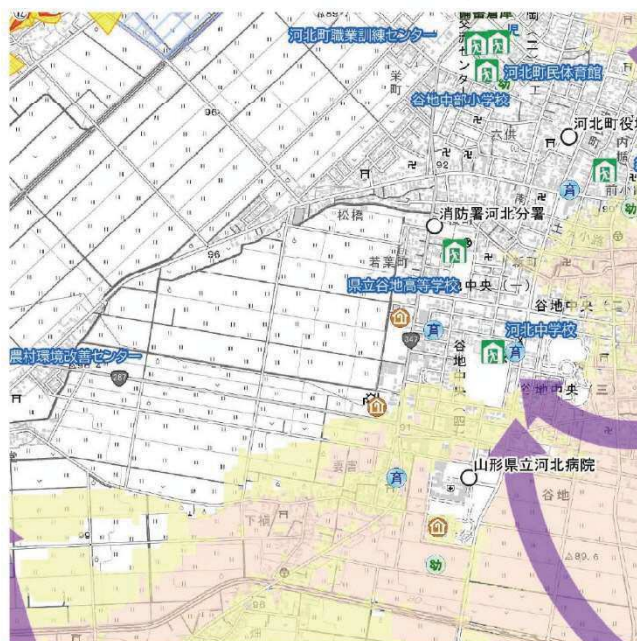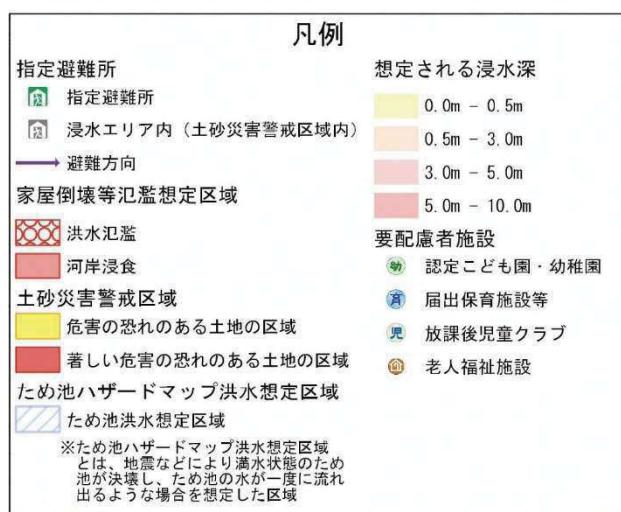

■河北町防災ハザードマップ

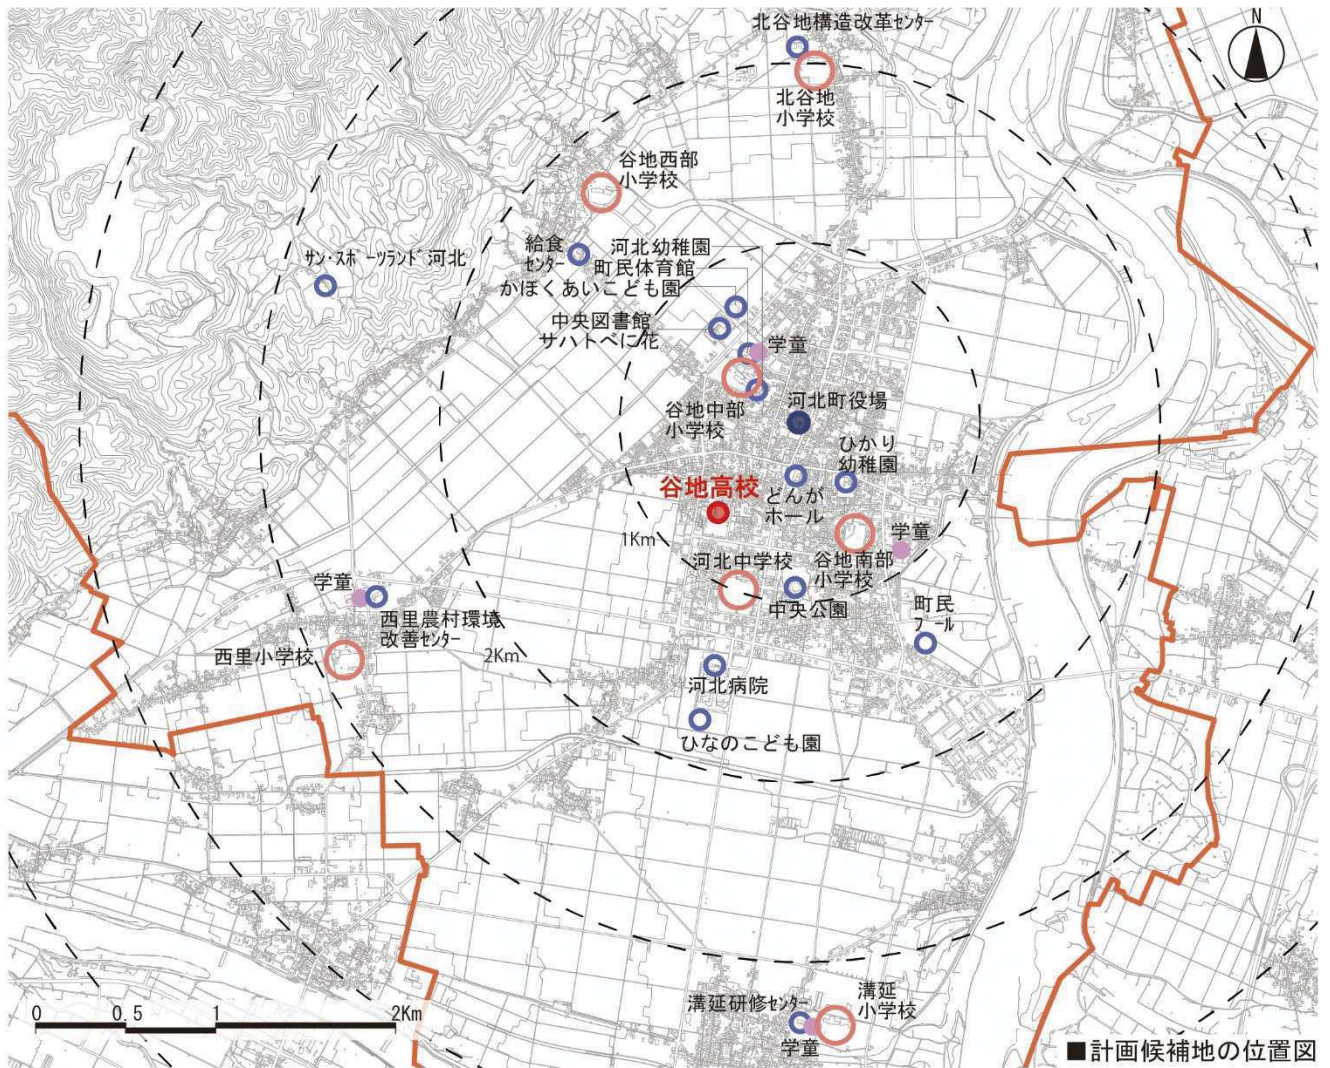

■谷地高校西側敷地の現況航空写真

2. 校舎・体育館の面積検討

1) 計画規模の検討方針

計画規模は、国庫補助の必要面積を基本とし、必要に応じて増やすこととします。

2) 必要面積の根拠となる計画学級数

①普通学級数の想定

小学校：15 学級

中学校：10 学級

②特別支援学級数の想定

特別支援学級の児童生徒数は、令和 4 年度 文部科学省調査結果（全児童生徒数の約 3.7%）をもとに、想定児童生徒数を想定し、公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律の特別支援学級の学級規模の標準（8 人／学級）のから算出した学級数を用いて校舎の必要面積を算出します。

3) 校舎・屋内運動場の必要面積

■学級数に応じた必要面積（二級積雪寒冷地、特別支援学級を含む）

統合小学校	校舎	:	5,910 m ²	（給食調理施設は別途）
	屋内運動場	:	1,258 m ²	
中学校	校舎	:	5,510 m ²	（武道場は別途）
	屋内運動場	:	1,237 m ²	

3. 整備方法の検討

1) 基本方針

- ①統合小学校は、最短で令和13年度に開校することを目指して整備する。
- ②小中一貫型小学校・中学校とし、小中連携・一貫教育を行いやすくする。

2) 整備方法の検討方針（案）

- ①統合小学校は、既存校舎を使用せず、新校舎として整備する。
- ②国庫補助を最大限に活用し、必要に応じてより交付税措置率の高い起債の利用等を検討する。
- ③令和13年度中に開校できる状態とする。

3) 公立学校施設整備にかかる補助金制度の概要（河北町の場合）

①小学校の校地に建設

小学校の不足分整備	1/2	※1
中学校の整備	単独事業	※2

②中学校の校地に建設

小学校の整備	1/2	※3
中学校の整備	単独事業	※2

③新しい校地を取得して建設[別途、土地取得・造成・農地転用他、水路・道路整備等の期間およびコストが必要]

小学校の整備	1/2	※3
中学校の整備	単独事業	※2

※1:小学校の既存校舎は築年数が浅いため、既存校舎面積分（保有面積）の整備は補助対象外

※2:中学校の既存校舎は耐力度調査結果が5000点以上のため、既存校舎面積分（保有面積）の整備は補助対象外

※3:小学校は新しい校地への移転統合するため、保有面積がゼロとみなされ、必要面積の全てが補助対象となる

4) 既存校舎の改修について

築20年以上が経過した既存校舎は、長寿命化改良事業による補助金（補助率1/3）を利用できます。
ただし、改良事業実施後30年以上使用する前提となることを考慮する必要があります。

5) 整備方法検討タイプ


- A-1案 河北中学校の校地に、小学校を整備し既存中学校と接続
- A-2案 河北中学校の校地に、小中学校を同時に一体的に整備
- B案 新しい校地を取得し、小中学校を同時に一体的に整備

6) 整備方法

河北町立小中学校整備検討委員会における意見を踏まえ、次頁の整備タイプのうち、整備方法、整備スケジュール及び財政負担を総合的に検討し、A-1タイプの河北中学校校地に小学校を整備し既存中学校と接続とします。中学校については、令和23年度開校を目安に想定し、小中学校を段階的に整備します。

7) 整備方法の検討

A-1タイプ 河北中学校校地に、小学校を整備し既存中学校と接続

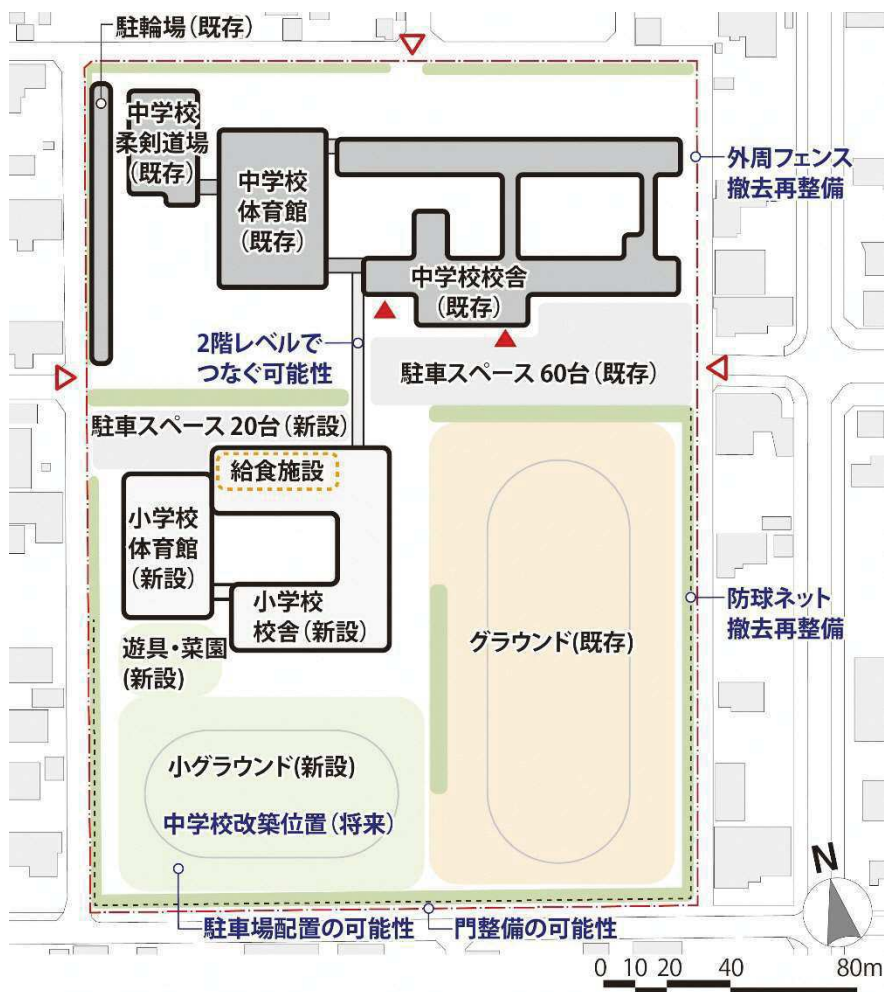

■事業コストイメージ

[施設整備費]

①小学校校舎整備費	約7,200㎡	補助事業
②中学校校舎整備費	—	
③給食施設	約450㎡	一部補助事業
④解体工事費	—	
⑤校庭外構整備費	約7,500㎡	
⑥仮設校舎賃貸借		

[用地関連費]

⑦用地取得費	—
⑧造成費	—

施設整備コスト比 (基準) 中学校校舎改修費を除く

■事業工程イメージ

令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度
基本構想 基本計画	パブ コメ 設計者選定	基本設計 実施設計・申請	施工者選定	統合小学校+一部中学校 新校舎建設	校庭 整備	■統合小 開校		

A-2-①タイプ 河北中学校校地に、小中学校を同時に一体的に整備(仮設なし)



■事業コストイメージ

[施設整備費]

①小学校校舎整備費	約7,200㎡	補助事業
②中学校校舎整備費	約7,200㎡	単独事業
③給食施設	約450㎡	一部補助事業
④解体工事費	約9,000㎡	
⑤校庭外構整備費	約13,500㎡	
⑥仮設校舎賃貸借	—	

[用地関連費]


⑦用地取得費	—
⑧造成費	—

施設整備コスト比 約2.1倍

■事業工程イメージ

令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度
基本構想 基本計画	パブ コメ 設計者選定	基本設計 実施設計・申請	施工者選定	統合小学校・中学校 新校舎建設	既存 解体	■統合小開校 校庭整備		

A-2-②タイプ 河北中学校校地に、小中学校を同時に一体的に整備(仮設校舎あり)

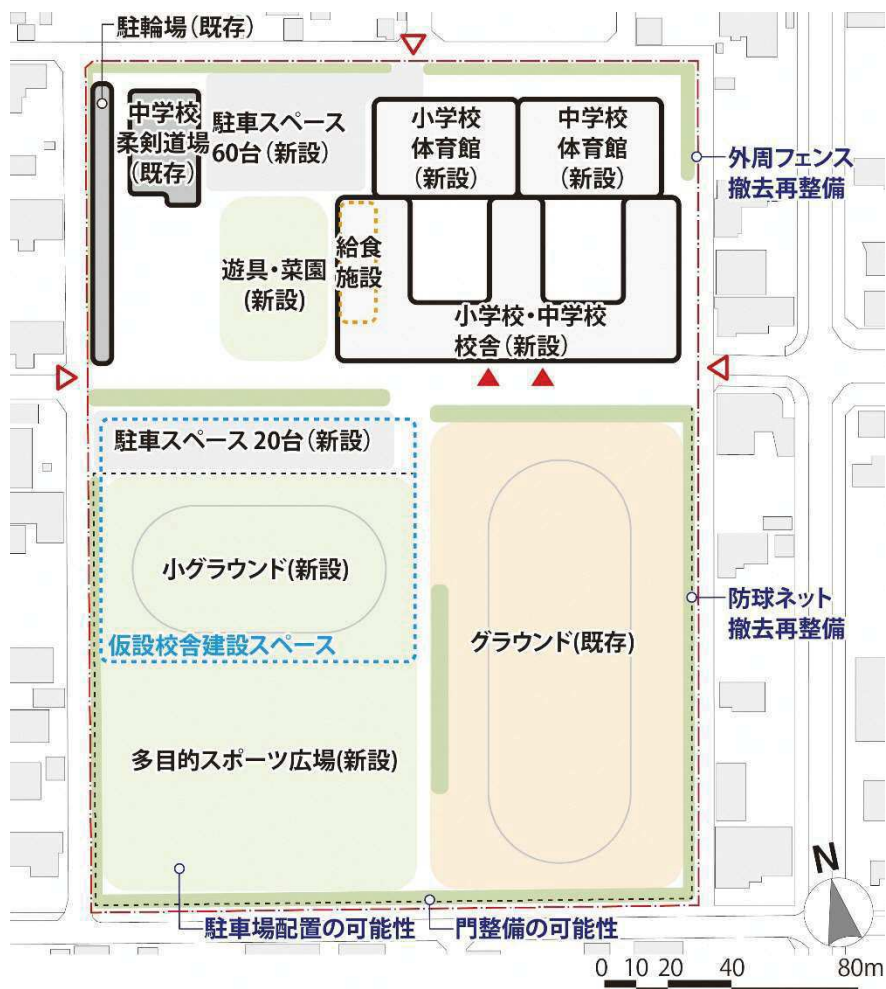

■事業コストイメージ

[施設整備費]

①小学校校舎整備費	約7,200㎡	補助事業
②中学校校舎整備費	約7,200㎡	単独事業
③給食施設	約450㎡	一部補助事業
④解体工事費	約9,000㎡	
⑤校庭外構整備費	約7,500㎡	
⑥仮設校舎賃貸借	約5,000㎡	

[用地関連費]


⑦用地取得費	—
⑧造成費	—

施設整備コスト比 約2.4倍

■事業工程イメージ

令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度
基本構想 基本計画	パブコメ 設計者選定 基本設計 実施設計・申請 仮設設計	仮設校舎建設	施工者選定 既存校舎 解体	統合小学校・中学校 新校舎建設	統合小開校 仮設解体	校庭整備 既存解体	遊び庭 整備	

Bタイプ 新規取得用地に、小中学校を同時に一体的に整備

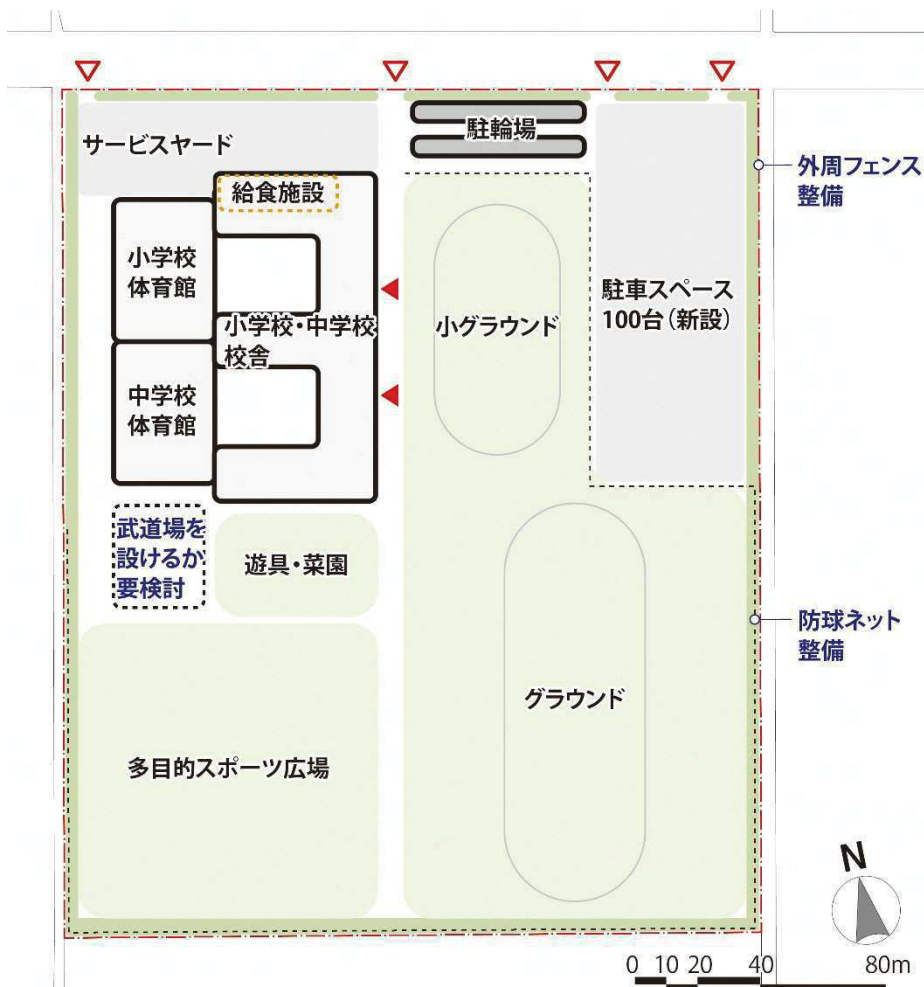

■事業コストイメージ

〔施設整備費〕

①小学校校舎整備費	約7,200㎡	補助事業
②中学校校舎整備費	約7,200㎡	単独事業
③給食施設	約450㎡	一部補助事業
④解体工事費	—	
⑤校庭外構整備費	約33,200㎡	
⑥仮設校舎賃賃借	—	

〔用地関連費〕

⑦用地取得費	約52,000㎡
⑧造成費	約52,000㎡

施設整備コスト比 約2.2倍 既存中学校校舎は残地

■事業工程イメージ

令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度
基本構想 基本計画	パブ コメ コンサル 選定	用地取得 測量・造成設計	設計者選定 基本設計 実施設計・申請 造成工事・インフラ整備等	施工者選定	統合小学校・中学校 新校舎建設・校庭整			■統合小開校

第4章 小中学校整備の基本コンセプト

1. 河北町小中学校整備の基本コンセプト(案)

河北町立小学校のあり方について（答申）および河北町立小学校の整備に向けた基本方針に示された方針や目標を実現するため、小中学校の施設整備における基本コンセプトを示す。

1 河北町の小学校と中学校の学びを一つにつなぐ学校づくり

- 学校・教員間において、小学校と中学校で目指す子どもの姿を共有、つながりのある学習指導・生徒指導を実現
- 確かな学力を育成し、予測困難な未来を生き抜くために、英語教育の推進等、幼小中高の連携を図る

2 子供、教職員、地域がいきいきと活動・交流できる、ゆとりある学び・育ちの場

- ICT教育環境を活用し、学びあい、高めあう学習を推進し、一人一人の良さを引き出しながら、子ども同士のつながりを広げ、深めていくことで社会性を育む

3 一人一人の発達段階や特性に応じ、様々な学習の場・居場所を選べる環境


- 一人一人の資質・能力を伸ばし、「生きる力」を育むために、少人数指導、習熟度別指導など多様な教育活動を実践すると同時に、教員間で学びあう機会を確保し、教育の質を向上
- 一人一人が伸び伸びと自己実現ができ、安全安心な学校生活が送れるよう、幼小中高の連携

4 学校と地域の歴史・文化を継承し郷土愛を育む、子供たちの未来を創る学校

- ふるさと学習を通して、地域と学校のつながりを深める
- 地域に根差したキャリア教育や自然を生かした環境教育

5 安全・安心で災害に強く、誰もが集う学校

- 防災機能の強化を図り、避難所や地域の防災拠点として活用できる施設を整備する
- 部活動の地域展開・地域交流の場として、スポーツ・文化活動や地域行事の利活用の機能を備える
- 安全安心でおいしい給食が提供できるようにする

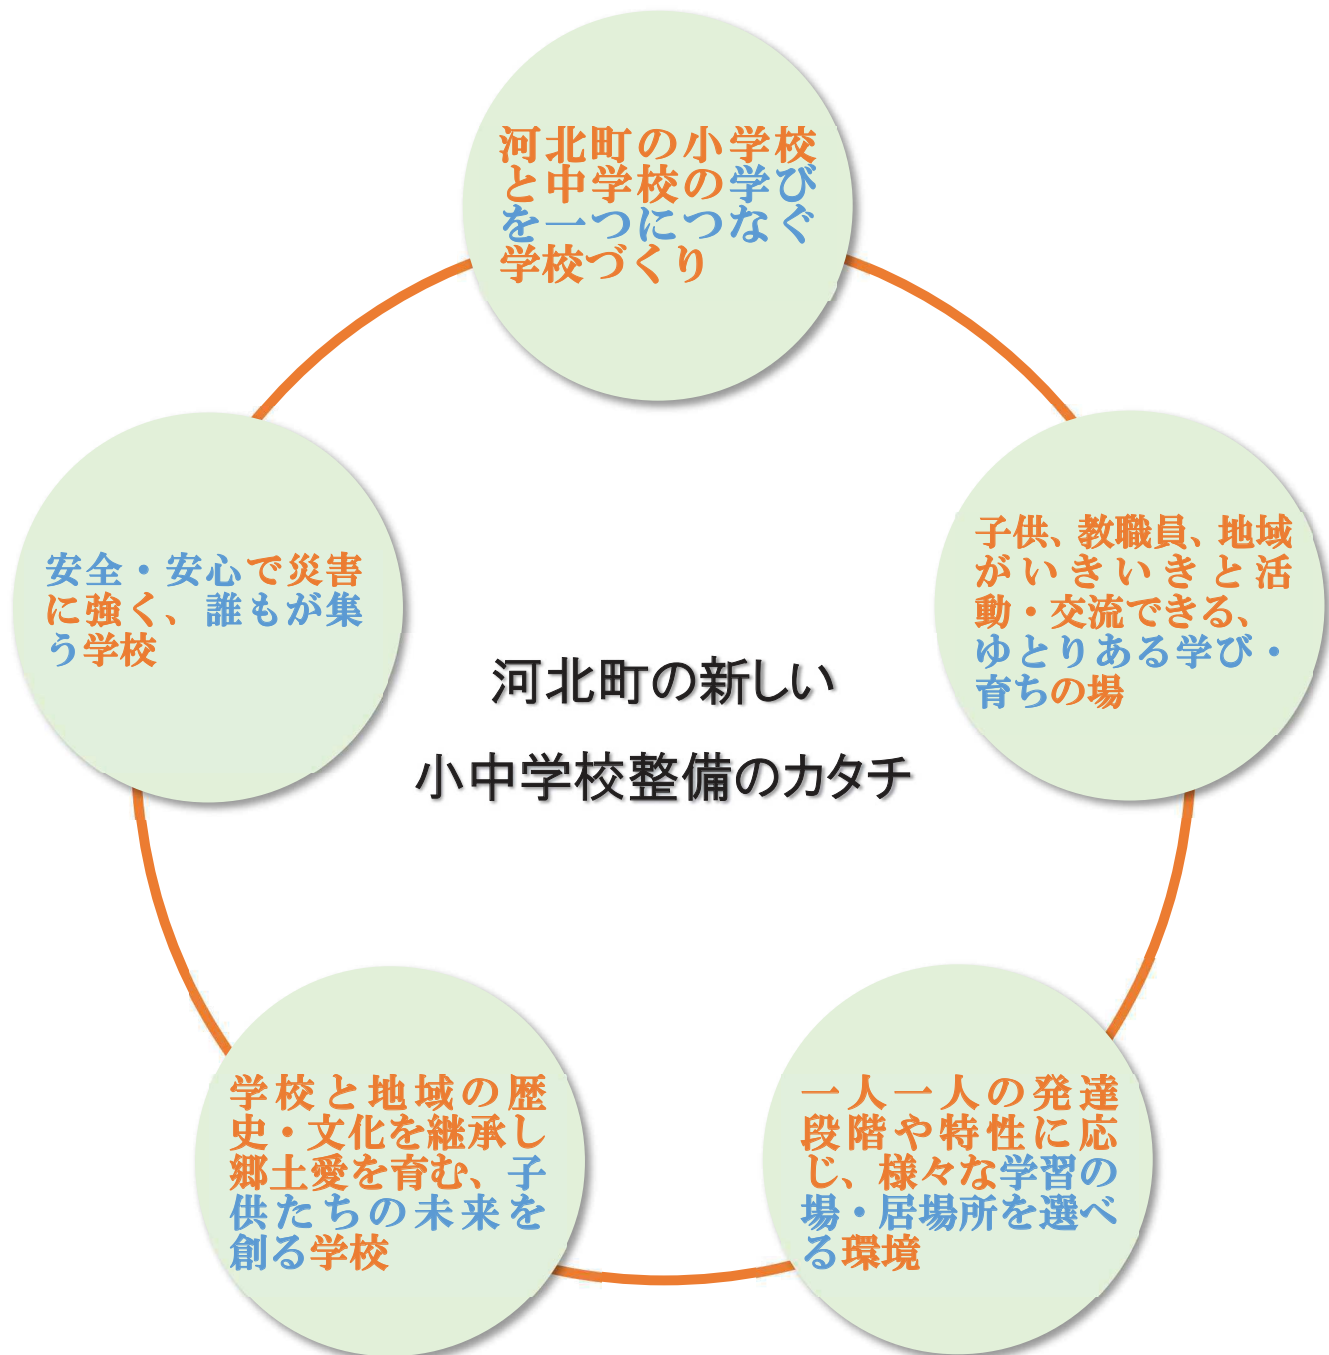

参考：施設構成の考え方(案)


■ゾーニング・平面計画

- ・普通教室ゾーン、ラーニングゾーン、特別教室ゾーン、教職員ゾーン、体育ゾーンの各ゾーンは、複数の室、多目的スペース、小室、教材スペース等、利用者、利用方法に応じたまとまりをつくり、個に応じた学びや協働的な学び、交流活動等、多様な活動を行いやすい構成とする。
- ・各ゾーンには、建具や家具、可動間仕切り、ICT 教育設備等により多様な活動空間が行える環境とするとともに、流しやトイレを充実し、生活環境として整える。
- ・各ゾーンと連続する廊下や屋外スペース等は、学習スペース、学習の成果等の掲示・展示のためのギャラリー、ベンチのある交流スペース等、建築や使い方の工夫により活動空間とできるように構成する。
- ・地域利用や避難所利用を考慮し、利用者や利用時間帯に応じた管理区画を適切に設置する。
- ・地域活動や避難所運営の拠点となるコミュニティルームを整備する。コミュニティルームは施設の貸し出し対応や学校における地域住民・組織の居場所ともなるよう、各施設との関係を考慮する。

■各室・スペース計画

①普通教室ゾーン

- ・普通教室は、8m×8m 程度、約 70 m²を基本とする。幅 7m 程度のワークスペースを確保し、学年ごとのまとまりをもって設置する。音を遮ることができ、作業やミーティング、個別指導等が行える小室を設ける。小室には教材を管理できる棚を設ける。
- ・特別支援学級の教室は、個々人の状態に応じて学習環境や生活環境を整えられ、普通学級との交流学习等が行いやすい位置に計画する。知的、情緒、肢体不自由の障害別のクラスを設置でき、子どもの状態に応じて建具や家具等で集団編制を変えて利用できる構成とする。
- ・通級指導室は、特別支援学級と連携できる位置に 2 室設置し、2 室を一体的に利用できるようにする。

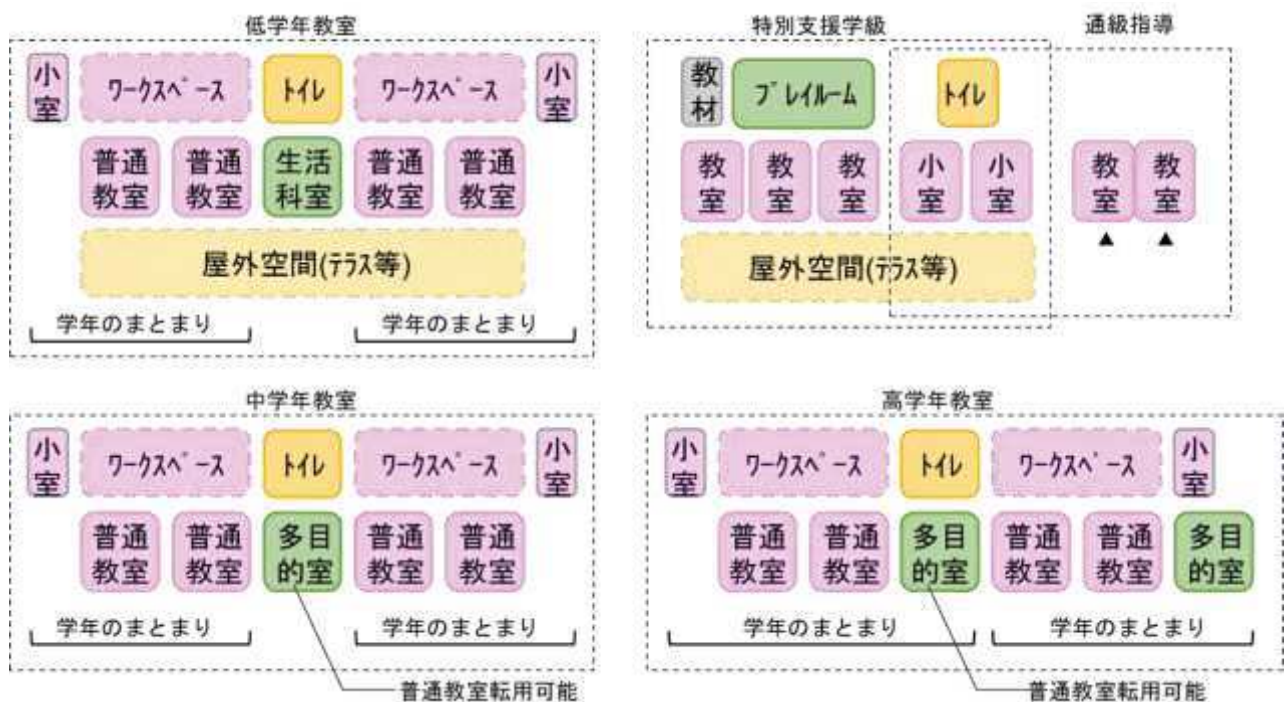


②ラーニングゾーン

- ・ラーニングゾーンは、各学年の普通教室からアクセスしやすく、気軽に授業や休み時間に利用できるように設置する。放課後や休日にも利用しやすい計画とする。
- ・図書館は、学校図書標準に基づき、9,160冊以上の蔵書が可能な計画とする。書架、新刊展示、ブラウジング、閲覧スペース等、多様なコーナーづくりを行い、利用人数や目的に応じ、居心地のよい場所となるようにする。
- ・多目的ホールと一体で整備し、ホール空間を閲覧スペースとしても利用できるようにする。
- ・多目的ホールを集会や発表で利用できるよう、ステージを計画する。ステージ上もランチスペースとして利用できるよう、210席のテーブル・イスを配置できるようにする。手洗い流しを用意する。
- ・図書室と連続した位置に、グループワーク等に利用できる学習室を設ける。


③特別教室ゾーン

- ・特別教室は、教科横断的な学習が行いやすいようにまとまりをもって配置する。
- ・共用部はギャラリー空間となるようにする。
- ・ラボ（理科室）は、設えの異なる2室を連携して利用できるようにする。
- ・ラボのうち1室をアトリエ（図工室）と隣接整備し、建具等を開放し一体に利用できるようにする。
- ・キッチンスタジオ（家庭科室）は、多目的ホールや屋外と連携して利用できるようにする。
- ・シアター（音楽室）は、遮音性や防音性を高め、音響のよい教室とする。


②ラーニングゾーン

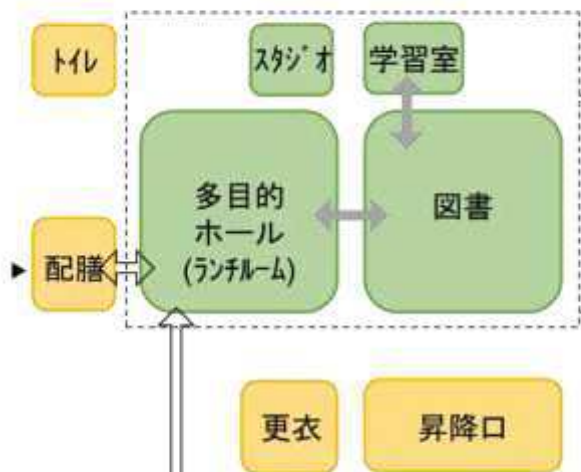

③特別教室ゾーン

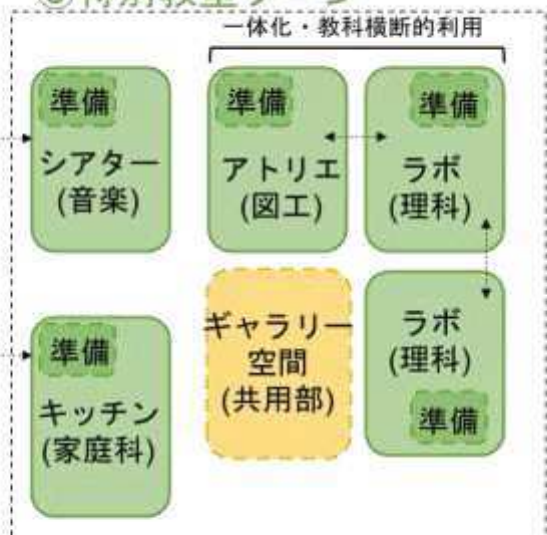

④教職員ゾーン・その他

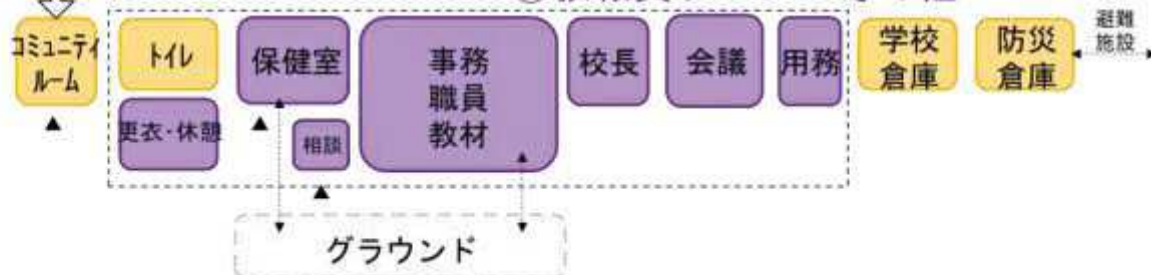


④教職員ゾーン

- ・教職員ゾーンは、各門・昇降口・グラウンド・駐車場等が見える位置に設置する。
- ・職員室まわりの諸室は一体的に整備し、個人利用スペースと協働利用スペースを活用でき、作業や制作内容に応じて使い分けられるようにする。相談スペースやラウンジコーナーなどを設け、リフレッシュやコミュニケーションのスペースとなるようにする。
- ・校長室は、職員室と連携をはかりやすい位置に設置する。
- ・保健室は、グラウンドや体育館から利用しやすく、緊急車両が寄り付きやすい場所に設置する。

⑤体育ゾーン

- ・アリーナは、一般用バスケットボールコート、バレーボールコート2面を基準とした寸法とする。
- ・サブアリーナは、軽運動や卓球が行える広さを確保し、災害時に配慮が必要な高齢者等の避難スペースとしても利用できるようにする。
- ・ミーティング室は、体育科の映像等を利用した講義、地域利用時の会議、災害時の救護スペース等としても利用できるようにする。
- ・玄関ホールは、放課後、土日・休日等の放課後児童クラブや地域での利用時、災害時の避難者受け入れ等を考慮し、多人数を受けとめられる間口・広さとする。

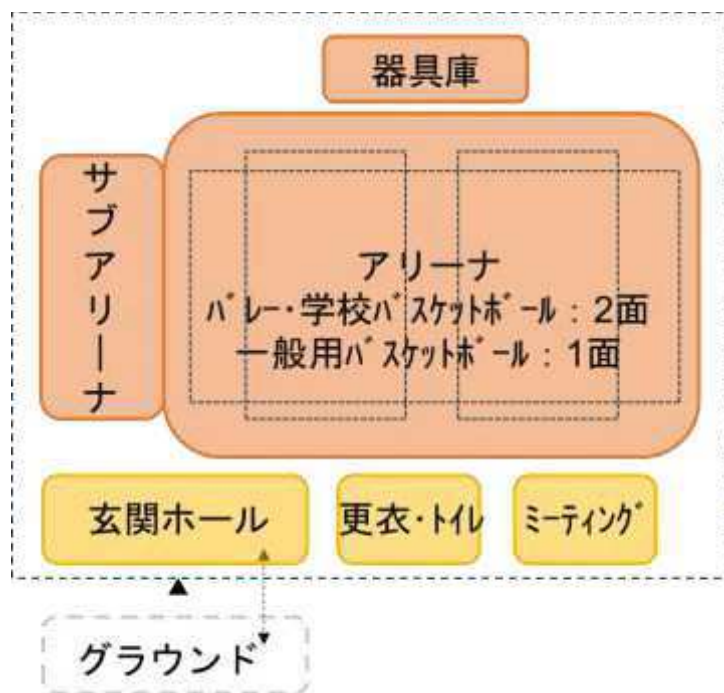

⑥給食調理施設

- ・ドライ方式の給食施設（800食程度）として450㎡程度を想定する。
- ・食材等の搬入ができ、小学校・中学校に配食しやすい位置に設置する。将来の中学校整備時にも対応できる位置を検討する。
